

崇德检测（2023）验字第04-002号

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)竣工环境保护验收报告

建设单位：江华冯乘发展集团有限公司

编制单位：长沙崇德检测科技有限公司

二〇二三年四月



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221820130395

名称: 长沙崇德检测科技有限公司

地址: 长沙高新开发区岳麓西大道240号节能环保产业园A2栋12、13楼

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由长沙崇德检测科技有限公司承担。

许可使用标志



221820130395

发证日期: 2022年02月23日

有效期至: 2028年02月22日

发证机关: 湖南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

建设单位法人代表： 姚英杰

编制单位法人代表： 夏抗

项目负责人： 彭金意

项目编制人： 彭金意

建设单位：江华冯乘发展集团有限公司（盖章） 电话：0746-2492532 传真：/ 邮编：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇香樟路1号 地址：江华冯乘发展集团有限公司（盖章）	电话：0731-89878596、0731-89878597 传真：0731-84429648 邮编：410000 地址：长沙市岳麓区高新开发区岳麓西大道2450号节能环保产业园A2栋 编制单位：长沙崇德检测科技有限公司（盖章）
---	--

目录

1. 项目概况	1
2. 验收监测依据	2
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2
2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	2
3. 项目建设情况	3
3.1 地理位置及平面布置	3
3.2 建设内容	6
3.2.1 项目建设情况	6
3.2.2 工程建设内容	6
3.2.3 项目主要设备	7
3.2.4 主要原辅材料及消耗	8
3.3 工艺流程	9
3.4 项目变动情况	9
4. 环境保护设施	11
4.1 污染治理、处置设施	11
4.1.1 废水	11
4.1.2 废气	11
4.1.3 噪声	11
4.1.4 固(液)体废物	12
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	13
4.2.1 环保投资	13
4.3 其他环保设施	13
4.3.1 环境风险防范措施	13
4.3.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	14
4.3.3 其他设施	14

5.环评主要结论与建议及审批部门审批决定	14
5.1 环境影响报告书主要结论及建议	14
5.1.1 主要结论	14
5.1.2 建议	14
5.2 审批部门审批决定	15
6. 验收执行标准	16
6.1 废水执行标准	16
6.2 废气执行标准	17
6.3 噪声执行标准	18
6.4 总量控制指标	18
7.验收监测内容	18
7.1 废水	18
7.2 废气	18
7.3 噪声监测	18
8. 质量保证及质量控制	19
8.1 监测分析及监测仪器	19
8.2 监测仪器	21
8.3 人员能力	22
8.4 质量保证与控制	22
8.5 验收监测期间气象参数	23
9. 验收监测结果	23
9.1 生产工况	23
9.2 污染物排放监测结果	24
9.2.1 废水监测结果与分析评价	24
9.2.2 废气监测结果与分析评价	26
9.2.3 噪声监测结果与分析评价	27
9.2.4 固(液)体废物	28
9.2.5 污染物排放总量核算	28
9.2.6 辐射	28
9.3 环境保护设施调试效果	29

9.3.1 环保设施处理效率监测结果	29
10.环境管理检查	31
10.1 环保设施调试运行效果	31
10.1.1 废水监测结论	31
10.1.2 废气监测结论	31
10.1.3 噪声监测结论	31
10.1.4 固体废物处置情况结论	32
10.1.5 环境管理检查情况	32
10.2 总体结论	32
10.3 验收监测建议	32
11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	33

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置及污染物监测布点图

附件：

附件 1 永州市生态环境局《关于江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表的批复》江环评字[2020]17号

附件2 排污许可证申领情况

附件3 污泥委托处置合同

附件4 检测报告

附件5 自查报告

附件6 其他事项说明

附件7 环境保护制度

附件8 工程竣工备案材料

附件9 工况表

附件10 验收意见

1. 项目概况

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)位于湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇，2020年9月，江华瑶族自治县城市建设投资开发有限公司（企业2022年7月更名为江华冯乘发展集团有限公司）北京国环益达环保技术有限公司编制的《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表》，并取得永州市生态环境局江环评字[2020]17号批复，主要建设内容为：新建处理规模分别为100m³/d(西区污水处理厂)、750m³/d(南区污水处理厂)的污水处理厂2座；总投资1371.16万元。污水处理工艺采用格栅-沉砂池+调节池+生物一体化处理装置(A²/O)+紫外线消毒处理，项目于2021年1月开工建设，2022年11月竣工。

本次验收内容为：江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)内容中750m³/d污水处理厂及配套污水管网，本项目实际只建设750m³/d污水处理厂及配套污水管网。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，所属行业已纳入排污许可管理，项目已申领排污许可证，证书编号为91431129753350195N06Q。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位已查清工程在施工过程中对环境影响报告文件和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

在此背景下，江华冯乘发展集团有限公司委托长沙崇德检测科技有限公司负责该项目工程的竣工环境保护验收监测工作。2023年3月10日，长沙崇德检测科技有限公司编制了《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)竣工环境保护验收企业自查报告》，自查报告结论如下：该项目环保手续齐全。该项目实际建设内容及各项环保设施建设情况与环评及其批复阶段一致，可开展竣工环境保护自主验收监测。

依据国家建设项目竣工环境保护验收相关要求和规定，受江华冯乘发展集团有限公司委托，长沙崇德检测科技有限公司负责该项目的竣工环境保护验收监测工作。2023年3月10日，长沙崇德检测科技有限公司组织相关技术人员对验收项目进行了现场勘察，经现场勘察及环境管理初步检查。目前生产及环保设施运行状况正常。按照验收监测方案，于

2023年3月21日至3月22日，长沙崇德检测科技有限公司对项目的污染源排放状况实施了现场监测，收集核实了有关资料，在此基础上编制本验收报告。

2. 验收监测依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
- (2) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行，2019年1月17日修订；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月29日第二次修订，2018年11月13日施行；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正，2018年6月1日实施；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日实施；
- (6) 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，2019年12月20日；
- (7) 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令，第682号，2017年10月1日；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- (1) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部办公厅，2018年5月16日；
- (2) 《城镇污水处理厂运行监督管理技术要求》HJ 2038-2014，2014年9月1日。

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

- (1) 《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表》，北京国环益达环保技术有限公司，2020年9月；
- (2) 《关于江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表的批复》，永州市生态环境局，江环评字[2020]17号，2020年10月26日。

3. 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)位于湖南省江华瑶族自治县涛圩镇，地理位置坐标：西区污水处理厂位于涛圩中学西侧，地理位置坐标：N：24° 50' 47.24"，E：111° 30' 16.99"；南区污水处理厂位于涛圩镇上晒田村西侧，地理位置坐标：N：24° 50' 29.38"，E：111° 29' 42.72"；项目地东距207国道650米、南距涛圩镇1200米、西临西河、北距S325省道20米根据污水生产工艺特点按功能分区原则划分为厂前区及生产区。


厂前区包括：在线监测室-仓库等设施。厂前区临相邻的现状道路或城镇规划道路布置，便于对外联系，且处于夏季最高风向频率的上风侧。

生产区包括：组合池（含粗细格栅、提升泵站、调节池、储泥池）、一体化泵站、紫外消毒计量渠等。生产区根据地形按工艺流程布置，格栅布置在厂区地势较低处，进厂管线顺畅，管线标高适合，生化设施布置在中部，污泥处理设施置于下风向。消毒系统靠近厂前区布置，以利于厂区出水。配电房靠近主要用电负荷区布置。地理位置示意图3-1所示，项目总平面布置图及监测点位图见图1所示。

项目大气环境敏感目标一览表见表3.1-1。

表 3.1-1 项目南厂区大气环境敏感目标一览表

类别	环境保护目标	坐标/m		方位/距离 (m)	功能及规模	评价标准
		X	Y			
环境空气	项目地东北侧居民	250	600	东北侧 600-1000	居民，约60户	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准
	项目地东南侧居民	300	-150	东南侧 300-500	居民，约200户	
	项目地西北侧居民	-300	0	西北侧 300-900	居民，约200户	
水环境	西河	/	/	西侧20米		《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准

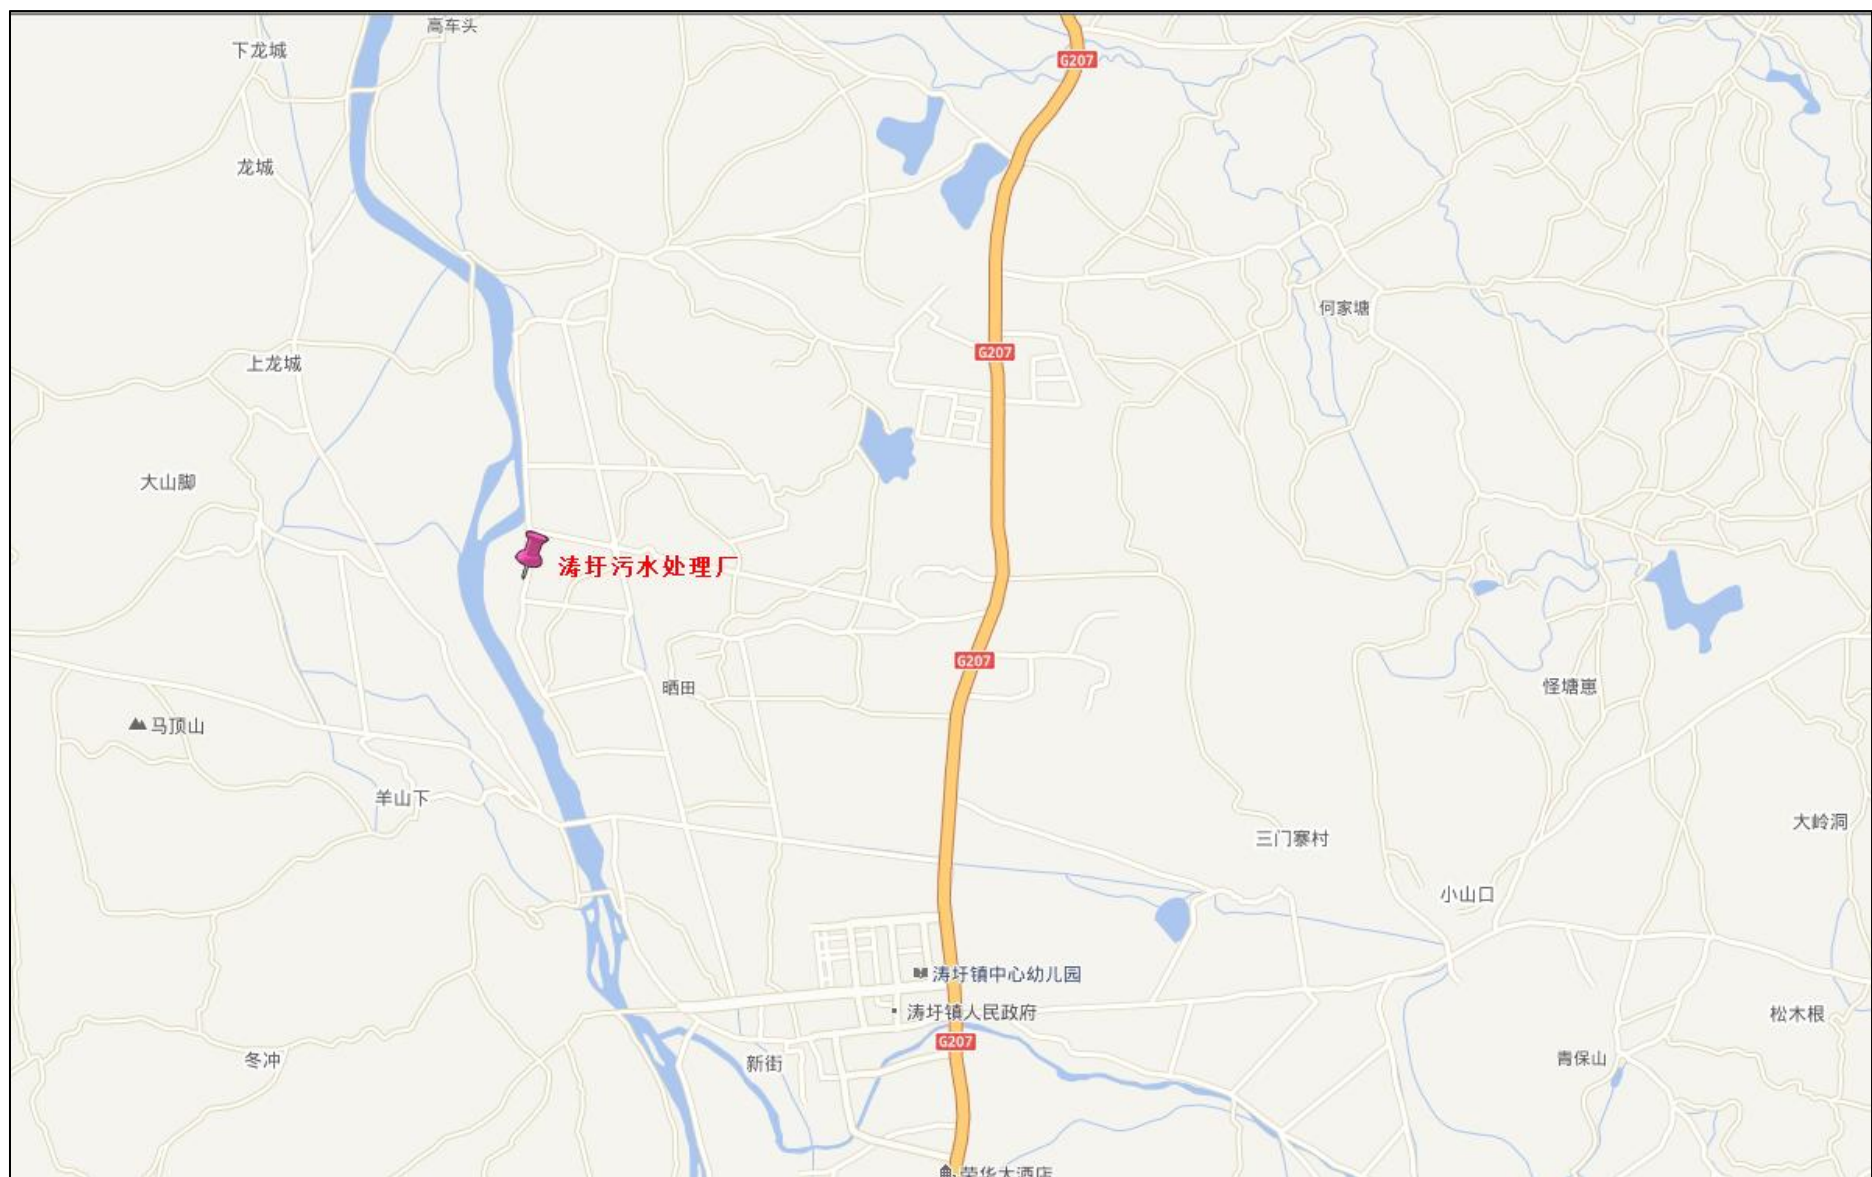

附图1 项目地理位置图

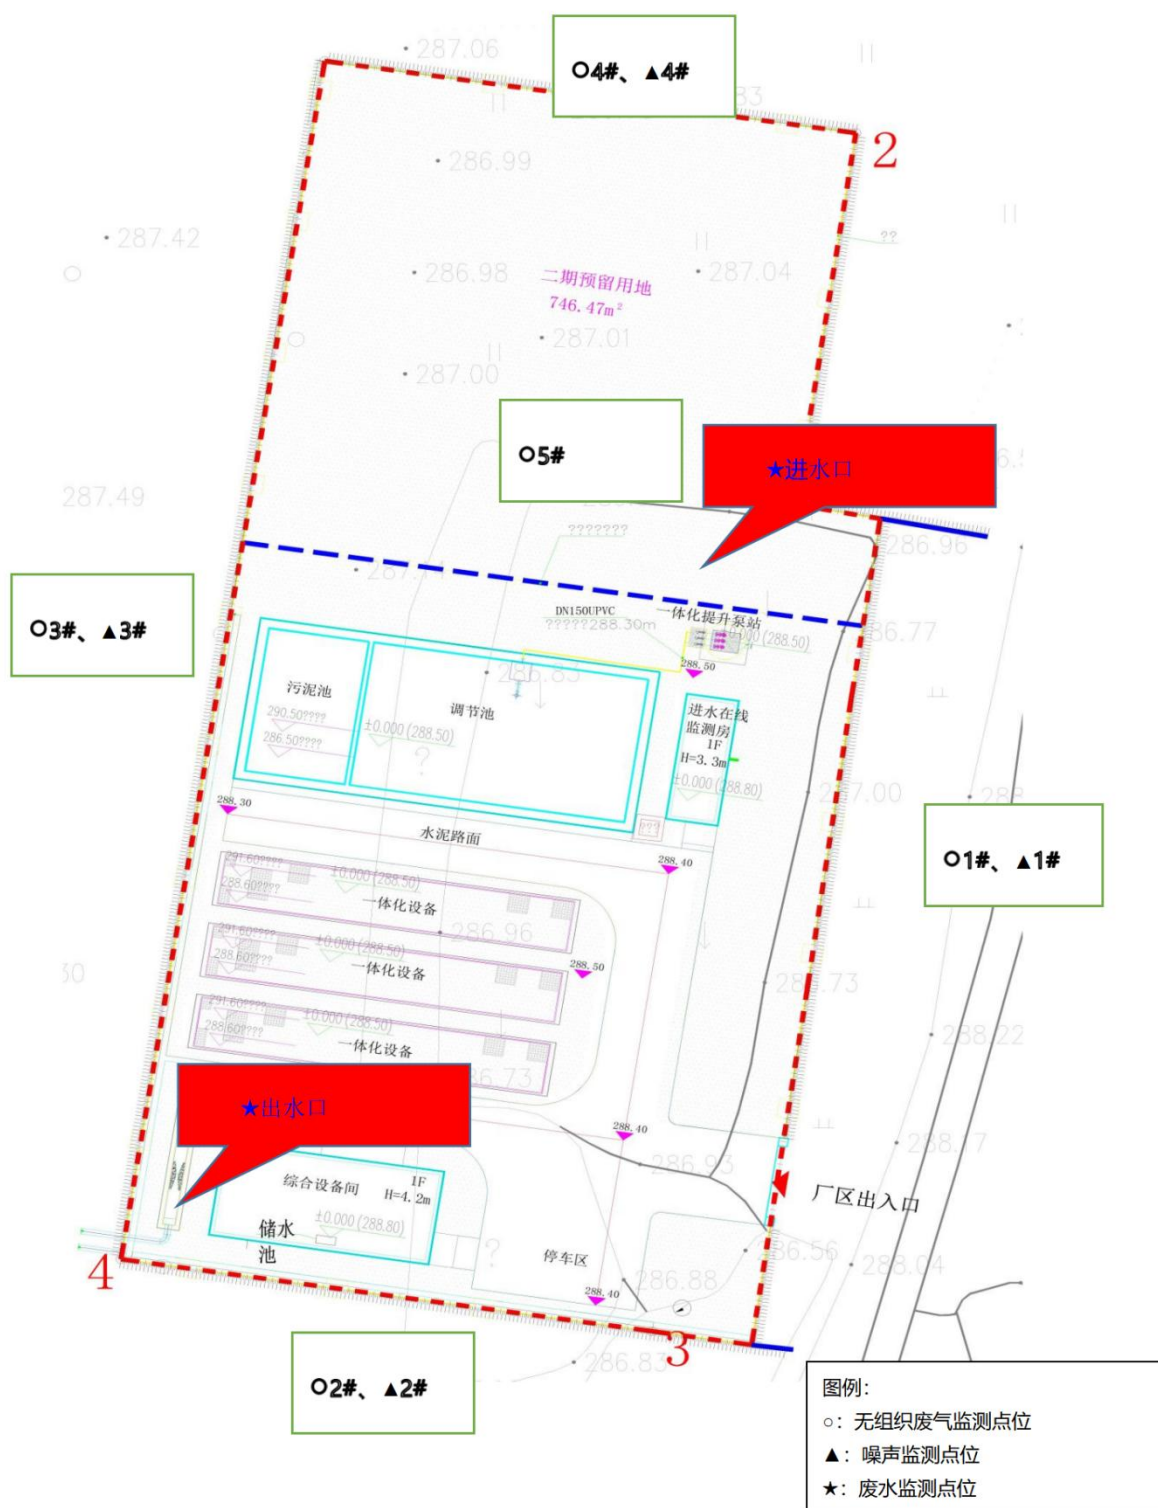


图 3-2 项目总平面布置及污染物监测布点图

3.2 建设内容

3.2.1 项目建设情况

工程建设情况见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目建设情况表

项目名称	江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目 (涛圩镇)				
建设单位名称	江华冯乘发展集团有限公司				
建设地点	湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇				
建设性质	新建				
行业类别	D4620 污水处理及其再生利用				
建设规模	新建750m³/d的污水处理厂1座				
工程主要建设内容	格栅调节池、提升泵房、A²/O 生物接触氧化一体化设备、紫外消毒一体化设备、在线监测室计量渠				
实际占地面积	771.4m²		实际绿化面积		466.0m²
法人代表	杨晴华	联系人	李江松		联系方式 13789237880
开建时间	2021年3月		竣工日期	2022年11月	调试时间 2023年3月
总投资 (环评)	1827.29万	环保投资 (环评)		93万	所占比例 5.1%
总投资 (实际)	1371.16万	环保投资 (实际)		75万	所占比例 5.47%
年工作时间	每年工作365天，每天24小时			职工人数3人	
环保处理设计单位	华南设计集团有限公司				
环保设施施工单位	湖南省天宇建设工程有限公司				
环评情况	2020年9月，北京国环益达环保技术有限公司编制《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网 建设项目 (涛圩镇)环境影响报告表》				
批复情况	2020年10月26日，《关于江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网 建设项目 (涛圩镇)环境影响报告表的批复》江环评字[2020]17号批复				
工程实际情况	实际运营、主体工程及环保设施运行情况正常				

3.2.2 工程建设内容

污水处理厂主要建设内容有: 粗格栅渠、调节池、A²/O生化池、紫外消毒及计量槽、污泥池、鼓风机房、在线监测室、综合管理用房。

表 3.2-2建设内容一览表

类别	工程名称	环评及批复工程内容	实际建设内容	备注
主体工程	污水处理厂	格栅/调节池/A ² /O一体化设备一座 设计流量100m ³ /天的污水处理厂、 一座设计流量750m ³ /天的污水处理	格栅/调节池/A ² /O一体化设备一座 设计流量750m ³ /天的污水处理厂	变动

		厂		
	污水管网	污水收集管10099m	污水收集管2489m	变动
辅助工程	紫外线消毒计量渠	/	无紫外消毒池，紫外消毒器位于一体化设备中	变动
配套工程	在线监测室	/	面积18.2m ²	一致
公用工程	给水	涛圩镇给水管网	涛圩镇给水管网	一致
	排水	采用雨污分流制，雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟，厂区污水用管道收集后排入污水厂粗格栅前，再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河	采用雨污分流制，雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟，厂区污水用管道收集后排入污水厂粗格栅前，再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河	一致
	供电	市政供电	市政供电	一致
环保措施	废水	采用雨污分流制。雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等污水自成系统，用管道收集后排入污水厂粗格栅前，再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河。	采用雨污分流制。雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等污水自成系统，用管道收集后排入污水厂粗格栅前，再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河。	一致
	废气	设置绿化隔离带，厂区臭气源采用封闭方式，对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理等	设置绿化隔离带，厂区臭气源采用封闭方式，对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理等	一致
	噪声	采用低噪设备、对设备间进行隔声处理	采用低噪设备、对设备间进行隔声处理	一致
	固废	格栅渣、沉砂池，运至垃圾填埋场填埋	污泥脱水处理后，再通过专用垃圾车外运至江华县无害化生活垃圾场进行处置。	一致
		污泥，运至垃圾填埋场填埋		一致
		生活垃圾，环卫部门处置	生活垃圾，环卫部门处置	一致

3.2.3 项目主要设备

项目工艺设备见表3.2-3。

表 3.2-3 主要设备及建筑物一览表

类别	建设规模及组成（环评）	实际建设内容	备注
粗细格栅	格栅池净尺寸：L×B×H=1.0m×5.0m×4.0m	①主要设备配置：水力机械细格栅筛：1台	环评初期未具体细化，实际建设设备有细微变化，整体内
调节池及污泥池	调节池净尺寸：L×B×H=14.5m×5.0m×4.0m	①有效容积：720m ³ 构筑物：调节池平面尺寸：B×L×H=20.0	

	污泥池净尺寸：L×B×H=5.0m×5.0m×4.0m	×9.0×4.0（m），1座，②主要设备配置： 潜污泵：2台，一用一备，Q=165m³/h，H=12m，N=11kW，配自耦及起吊装置；高速潜水搅拌机：2台，Φ325，n=720rpm，N=2.2kW，配起吊装置； 手动葫芦：1台，T=0.5t，仓库冷备； 潜污泵：1台，Q=15m³/h，H=13m，N=1.1kW。	容一致
A2/O 一体化设备	一体化污水处理系统：工艺 A' O 污水处理系统设计流量：100 吨/天 一体化污水处理系统：工艺 A' O 污水处理系统设计流量：750 吨/天	①设计流量：Q=750m³/d； ②构筑物： AAO 生化池：1座 3组，尺寸 B×L×H=3.2×18.0×3.2(m) ③主要设备配置： 设备总装机功率：28.15KW；	
一体化提升泵站	无具体信息	①构筑物：尺寸 B×L×H=2.3×2.3×0.5(m)， ②主要设备配置： 潜污泵：3台，Q=40m³/h，H=12m，N=3.7kW。	
紫外消毒及计量槽	无具体信息	①构筑物： 紫外消毒池：1座，尺寸 L×B×H=5.0×3.6×1.9（m）； 巴氏计量槽：1座，尺寸 L×B×H=7.5×0.5×1.4（m）； ②主要设备配置： 管式紫外消毒设备：1套，Q=100m³/h，配套 155W 紫外灯管 12 支及镇流器、控制系统、 自动清洗系统等，整套装置总功率 1.86kW； 巴氏计量槽：1台，计量范围 1.5-100L/s。	
在线监测室	无具体信息	建筑面积：18.2m²。	
综合管理用房	无具体信息	建筑面积：57.2m²	
备注	项目实际建设只建设了一座设计流量：750 吨/天的污水处理厂		

3.2.4主要原辅材料及消耗

项目主要原辅材料情况见表3.2-4。

表3.2-4项目主要原辅材料情况

序号	原辅材料名称	环评预计年消耗量 (t/a)	实际年消耗量 (t/a)
1	PAC	/	7
2	PAM	/	1.4
3	水	/	3

4	电	/	3.5 万度
---	---	---	--------

3.3 工艺流程

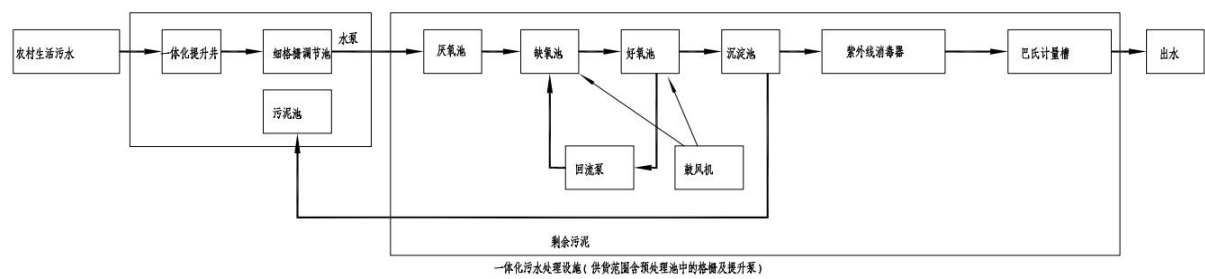


图 3.3 污水处理厂运营工艺流程图

运营期工艺流程简述：污水处理厂进水先经粗细格栅去除大部分的垃圾，后通过潜污泵将污水提升至进入调节池，沉砂区域去除大的颗粒物，调节池调节水质水量，后进入一体化设备， 在一体化设备中利用系统内微生物的作用，经历生物膜的厌氧、缺氧、好氧反应过程， 有效去除有机物及氮、磷，后经膜过滤保证出水水质，出水经紫外消毒系统，去除污水中的细菌、致病菌等有害物质后经出水计量井计量达标排放进入纳污河流。

3.4 项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，根据本项目环评报告及其批复内容，对照《污染影响类建设项目重大变动单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688)号，项目变动内容如下：

表3.4-1项目变动情况一览表

环办环评函[2020]688号文	实际建设情况	原因分析	是否属于重大变动
1. 建设项目开发、使用功能发生变化的。	建设项目开发、使用功能无变化	/	否
2. 生产、处置或储存能力增大30%及以上的	生产、处置或储存能力减小	/	否
3. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。	生产、处置或储存能力无变化	/	否
4. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加	项目生产、处置或储存能力未增大，未导致相应污染物排放量增加	/	否

10%及以上的。			
5. 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	项目厂区地址无变化	/	否
6. 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1) 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；(2) 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3) 废水第一类污染物排放量增加的； (4) 其他污染物排放量增加 10%及以上的。	项目产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料均未变化	/	否
7. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	物料运输、装卸、贮存方式未变化	/	否
8. 废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	废气、废水污染防治措施未变化	/	否
9. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	未新增废水直接排放口；废水直接排放口位置未变化	/	否
10. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。	无	/	否
11. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。	噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化	/	否
12. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	固体废物利用处置方式无变化	/	否
13. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	事故废水暂存能力或拦截设施未变化	/	否

根据现场调查，项目仅建设了750m³/d的南厂区，西厂区已取消建设，由于生产、处置或储存能力减小不属于重大变更范围。

4.环境保护设施

4.1 污染治理、处置设施

4.1.1 废水

项目废水包括涛圩镇镇区范围内的居民生活污水、厂区生活污水，所有污水最后排入粗格栅池进入污水处理系统进行处理，厂区自身污水产生量较小，经污水处理系统处理达标后排放，措施可行，项目尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。污水处理达标尾水排入西河。废水排放及其处理设施见表4.1-1。

表4.1-1 废水排放及其处理设施

类型	产污环节	主要污染因子	产生规律	处置方式及设施	外排方式
服务区废水	服务范围内生活污水	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、总氮、总磷等	连续	采用“格栅-沉砂池+调节池+生物一体化处理装置(A2/O)+紫外线消毒处理”处理工艺处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后经管道排放至西河。	间接排放
厂区生活污水	值班生活	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、总氮、总磷等	间歇	进入本污水处理厂处理	间接排放

4.1.2 废气

项目产生的废气主要为污水处理厂恶臭气体、检查井井盖挥发出来的少量恶臭气体及备用柴油发电机废气。

废气排放及其处理见表4.1-2。

表 4.1-2废气污染源及处理措施

产污环节	主要污染因子	处置方式	产生规律	外排方式
污水处理工艺	氨、硫化氢、臭气浓度	采取密闭，减少无组织排放	连续	无组织排放
柴油发电机废气	CO、烟尘等	自然通风	间歇	无组织排放

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于提升泵、搅拌机等配套设备运行噪声，项目设备噪声源的强度详见下表 4.1-3：

表 4.1-3 项目噪声源强一览表 (声级单位: dB (A))

序号	设备名称	数量	噪声源位置	源强	备注
1	提升泵	2 台	污水泵房	75	持续
2	搅拌机	4 台	调节池	75	持续
3	鼓风机	1 台	一体化处理设备	80	持续
4	加药泵	4 台	加药间	75	持续

4.1.4 固 (液) 体废物

本项目产生的固体废物主要是污水处理厂栅渣和污泥、废药剂包装袋及废紫外线灯管。

(1) 格栅渣和污泥

项目污泥暂存于污泥储存池, 通过专用垃圾车外运至送永州市南部生活垃圾焚烧发电厂处理处置进行处置。

(2) 废药剂包装袋

本项目在运营过程使用 PAC、PAM会产生一定量的废包装袋, 根据类比可知, 项目废包装袋的产生量约为0.035t/a。该部分废包装袋集中收集交由生产厂家回收处理。

(3) 废紫外线灯管。

本项目在运营过程会产生一定量废紫外线灯管, 根据类比可知, 项目废灯管的产生量约为60支/年。废紫外线灯管属于危险废物, 集中收集交由有资质单位处理。

表 4.1-4 固体废弃物产生情况及处置方式 (单位: t/a)

序号	固体废物名称	属性	产生量 (t/a)	处置方式
1	生活垃圾	一般固废	20	环卫部门统一清运
2	格栅渣	一般固废	27.375	通过专用垃圾车外运至送永州市南部生活垃圾焚烧发电厂处理处置进行处置。
3	污泥	一般固废	78.46	
4	废药剂包装袋	一般固废	0.035	废包装袋集中收集交由生产厂家回收处理
5	废弃紫外灯管	危废固废	6支	项目才开始运行还未产生, 后续运行中产生后集中收集交由有资质单位处理。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1 环保投资

工程建设总投资费用1371.16万元，其中环保投为75万元，占总投资的5.47%。具体见表4.2-1：

表 4.2-1 环保投资估算

时段	项目		环保措施	环保投资(万元)	备注
施工期	废气	施工扬尘	围挡、洒水降尘、加盖篷布、车辆过水池	10	
	噪声	施工设备	采用低噪声设备、管网施工建立隔声障等	5	
	固废	生活垃圾、建筑垃圾	生活垃圾、建筑垃圾、收集，交当地环境卫生部门妥善处理	6	
	生态环境		水土流失防治、生态恢复	10	
运营期	废气	恶臭	厂区绿化	10	
	噪声	设备噪声	采用低噪产品、对设备间进行隔声处理	10	
			西区污水处理厂南、北面设置隔声墙	10	
	固废	生产固废、生活固废	栅渣、沉砂、污泥运输和处置，设置垃圾桶	9	
	尾水监测		在线监测仪器	5	
	合计			75	

4.3 其他环保设施

4.3.1 环境风险防范措施

4.3.1.1 主要的环境风险源

本项目环境风险主要为废水处理设施非正常排放突发环境事件。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)的要求，且经查HJ169-2018附录中有毒和爆炸物质名称及临界量识别，本项目不存在重大危险源。

4.3.1.2 废水处理系统故障突发环境事件

废水设施发生故障停止运行导致废水未及时处理直接外排大圩河。对废水非正常排放事故防范措施如下：

- ①污水处理设施由专人负责，并定期对设备进行保养和维护，保证设备的正常运转；
- ②如紧急停电，对污水处理设施的供电系统实行双回路控制，提供备用发电设备应急使用。

4.3.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目设置1个废水排放口，目前已按规范设置标识标牌，排污口设置路径和去向合理，便于采集样品、监测计算和日常环境监督管理。污水处理厂出口安装有在线流量计，排放口安装COD、氨氮等在线监测系统。

4.3.3 其他设施

(1) “以新带老”改造工程

本项目不涉及“以新带老”改造工程。

(2) 关停或拆除现有工程

本项目不涉及关停或拆除现有工程。

(3) 淘汰落后生产装置

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的生产设备均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

(4) 生态恢复工程

本项目施工期已最大程度减少植被破坏，对破坏的植被进行清理并重新恢复。

(5) 绿化工程

本项目厂区已进行绿化工程。

(6) 边坡防护工程

本项目不涉及边坡防护工程。

5.环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论及建议

5.1.1 主要结论

本项目为基础设施建设项目，项目建成投入营运后，将有效解决涛圩镇生活污水的污染问题，有效地改善当地的污染问题，减轻水环境污染负荷，其社会效益、经济效益是显著的。落实环保措施后、对周边环境影响小，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

5.1.2 建议

1、建设单位在施工过程中应加强管理，严格落实本报告表提出的环保措施，做好水土保持的管理和监督工作，防止对生态环境和水土流失造成影响。

2.严格遵守“三同时”管理制度。加强厂区环保管理，建立、健全环保制度和环境管理机构，配备专职环保监测管理人员并落实相关责任，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。

3、认真树立环保意识，做好“三废”排放处理工作，不得乱排乱放，不得随意倾倒垃圾和污泥。

4、施工单位应有专人负责施工污染控制工作，实行项目环保工作责任制。确保建设资金的投入，加快施工进度，缩短施工期以减轻施工期的环境影响。

5.2 审批部门审批决定

永州市生态环境局于2020年10月26日以江环评字[2020]17号对《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表》进行了批复。

长沙崇德检测科技有限公司于2023年3月21日~22日，对江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环评批复要求及配套环保设施运行情况进行了现场检测与批复落实的调查，检查结果见表 5.2.1。

表 5.2.1 环评批复落实情况

序号	批复要求	落实情况	是否落实
1	落实施工期各项污染防治措施。配套的排水管网工程，须科学设计和施工，避免产生的塌陷等地质环境问题；合理安排各类施工机械的工作时间，并选用低噪声设备和采取降噪、减振、消声等措施，减少噪声对周边环境的影响；加强对施工路线附近环境敏感点的保护，防止噪声扰民；建筑材料堆放场、施工场地必须采取环保措施防止暴雨径流引起水体污染；开挖过程中产生的土石方及时回填，严禁随意堆洒，以避免造成水土流失和城市下水道淤塞；避免因施工方式不当破坏城市美观，采取有效措施防止因工程施工对民众出行等日常活动造成不良影响。	施工期已结束，相应的环境污染已不存在。	已落实
2	出水水质必须稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准，排入西河。废水排放量31.025万吨，主要污染物预测年排放为：COD为18.615t/a,NH ₃ -H为2.48t/a,总磷0.307t/a,总氮6.206t/a。	出水水质经检测，达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B类标准，最终排入西河；主要污染物年排放为：COD为2.752t/a, NH ₃ -H为0.038t/a, 总磷0.006t/a,总氮0.4196t/a未超出预测年排放。	已落实
3	所选用的设备、环保设施符合国家产业政策及质量安全要求。按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-95)的规定，设置国家环保部统一	已按国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-95)的规定，设置了国家环保部统一的环境保护图形标志牌。	已落实

	的环境保护图形标志牌。应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。		
4	污水处理厂设置的卫生防护距离范围内，不宜规划、建设学校、医院、民用住宅等敏感建筑和对环境空气质量要求高的项目，建设方应协助当地政府做好上述工作。项目需采用严格的污染防治措施，特别是对产生臭味大的点位应采取密封、集中处理等措施，减少无组织排放量。在采取严格的治理措施的前提下，加强对厂界及周边环境的恶臭监测，防止超标和影响周边群众生活。	污水处理厂设置的卫生防护距离范围内，暂未规划、建设学校、医院、民用住宅等敏感建筑和对环境空气质量要求高的项目；项目采用严格的污染防治措施，对恶臭气体采取了密封、集中处理等措施，减少无组织排放量。经检测，无组织废气达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4的二级标准要求。	已落实
5	建立风险事故防范与应急预案，防止污水处理厂因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放对河水水质产生影响。在纳污河段枯水季节时，要采取有效措施，防止非正常排放对其产生污染。	企业已编制应急预案	已落实
6	强化生态保护和水土保持措施，加强对施工期结束后的生态恢复，防止水土流失和生态破坏。	目前已经进行部分生态恢复。	已落实
7	生活垃圾严格按照环卫部门的有关要求进行处理。对污泥进行脱水处理，脱水后的污泥含水率满足国家相关标准，通过专用垃圾车外运至江华县无害化生活垃圾场进行安全卫生填埋处置。	建筑垃圾、生活垃圾均按照环卫部门的有关要求进行处理。对污泥进行脱水处理，脱水后的污泥运至江华县无害化生活垃圾场进行处置。	已落实
8	加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好本项目与周边的关系，项目建设、运营须采取有效措施，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。	经调查，暂未收到周边居民的投诉现象。	已落实

6. 验收执行标准

根据永州市生态环境局《关于江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表的批复》，验收监测结果的评价标准如下：

6.1 废水执行标准

废水排放执行标准见表6.1-1

表 6.1-1 废水执行标准

污染因子	标准值	验收执行标准
pH 值	6-9	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B类标准
氨氮	8 (15)	
化学需氧量	60	
五日生化需氧量	20	

悬浮物(SS)	20	
阴离子表面活性剂	1	
色度	30	
总磷(以P计)	1	
总氮(以N计)	20	
石油类	3	
动植物油	3	
粪大肠菌群	10 ⁴	
汞	0.01	
六价铬	0.05	
铅	0.1	
镉	0.01	
铬	0.1	
砷	0.1	
甲基汞	不得检出	
乙基汞	不得检出	

6.2 废气执行标准

6.2.1 无组织废气排放标准

无组织废气排放执行标准见表6.1-1。

表 6.1-1 无组织废气执行标准

污染物名称	标准限值 (mg/m ³)	标准来源 (环评及环评批复)
氨	1.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4二级标准
硫化氢	0.06	
臭气浓度	20 (无量纲)	
甲烷	1 (%)	

6.3 噪声执行标准

工业企业厂界噪声排放执行标准见表6.3-1。

表 6.3-1工业企业厂界噪声执行标准

类别	检测点位	标准限值		验收执行标准
厂界噪声	厂界四周	昼间	60dB (A)	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中的2类
		夜间	50dB (A)	

6.4 总量控制指标

根据北京国环益达环保技术有限公司编制了《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表》可知本项目属于废水处理工程,根据总量控制的相关办法,建议不购买总量指标,仅核算指标数量。

7.验收监测内容

7.1 废水

本次验收对废水进口、出口进行采样检测,项目废水监测内容见表7-1,监测布点情况见图3-2。

表 7-1 项目废水监测内容

类别	监测点位	监测项目	监测频次
综合废水	废水进口、出口 ★1-2	pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、六价铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、烷基汞	监测2天,每天4次

7.2 废气

无组织废气监测内容及频次表7-2,监测点位见图3-2。

表 7-2 无组织废气监测内容及频次

监测点位	点位编号	监测项目	监测频次
东面厂界边界1#、 南面厂界边界点2#、 西面厂界边界点3#、 北面厂界边界4#、 污水处理站进水口	/	氨、硫化氢、臭气浓度	连续2天,每天3次

7.3 噪声监测

厂界噪声布设监测点位4个,具体监测内容及频次见表7-3,具体监测点位布设位置见图3-2。

表 7-3 噪声监测内容及频次

序号	监测点位	点位编号	监测项目	监测频次
1	厂界四周	1#、2#、3#、4#	工业企业 厂界噪声	连续2天,每天昼、夜各监测1次

8. 质量保证及质量控制

8.1 监测分析及监测仪器

项目监测分析方法，见表8-1。

表8-1监测分析方法

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
无组织 废气	氨气	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	722可见分光光度计 /CDJC-YQ-002	0.01mg/m ³
	硫化氢	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》GB/T 11742-1989	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.005mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	/
	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC7900 气相色谱（非甲烷总烃测试仪）/CDJC-YQ-064	0.06mg/m ³
废水	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	DZB-718 便携式多参数分析仪/CDJC-YQ-268	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989	BSA224S 型电子天平/ CDJC-YQ-012	4mg/L
	色度	稀释倍数法《水质 色度的测定》 HJ 1182-2021	/	2 倍
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	HCA-102标准COD消解器 /CDJC-YQ-010	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	LRH-250A 生化培养箱 /CDJC-YQ-009	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.01mg/L

类别	检测项目		分析方法	使用仪器	检出限
	总氮		《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
	石油类		《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U 红外分光测油仪/CDJC-YQ-349	0.06mg/L
	动植物油				0.06mg/L
	总砷		《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计/CDJC-YQ-178	3×10 ⁻⁴ mg/L
	总汞				4×10 ⁻⁵ mg/L
	总铅		《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	iCAP 7200 电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280	0.07mg/L
	总铬				0.03mg/L
	总镉				0.005mg/L
	六价铬		《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-1987	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.004mg/L
	阴离子表面活性剂		《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
	粪大肠菌群		《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	CSH-400SD 恒温恒湿箱/CDJC-YQ-059	20MPN/L
	烷基汞	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993	GC-2010Pro 气相色谱仪/CDJC-YQ-320	1×10 ⁻⁵ mg/L
		乙基汞			2×10 ⁻⁵ mg/L
地表水	pH		《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-718 便携式多参数分析仪/CDJC-YQ-268	/
	化学需氧量		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	HCA-102标准COD消解器/CDJC-YQ-010	4mg/L
	五日生化需氧量		《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	LRH-250A 生化培养箱/CDJC-YQ-009	0.5mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.025mg/L
	总磷		《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.01mg/L
	总氮		《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
噪声	工业企业厂界噪声		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	AWA6228-4 多功能声级计/CDJC-YQ-021	25-125dB（A）

8.2 监测仪器

项目监测使用仪器，见表8-2。

表8-2 监测使用仪器

类别	检测项目		使用仪器	检出限
无组织 废气	氨气		722可见分光光度计/CDJC-YQ-002	0.01mg/m ³
	硫化氢		UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.005mg/m ³
	臭气浓度		/	/
	甲烷		GC7900 气相色谱（非甲烷总烃测试仪） /CDJC-YQ-064	0.06mg/m ³
废水	pH		DZB-718 便携式多参数分析仪/CDJC-YQ-268	/
	悬浮物		BSA224S 型电子天平/ CDJC-YQ-012	4mg/L
	色度		/	2 倍
	化学需氧量		HCA-102标准COD消解器/CDJC-YQ-010	4mg/L
	五日生化需氧量		LRH-250A 生化培养箱/CDJC-YQ-009	0.5mg/L
	氨氮		UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.025mg/L
	总磷		UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.01mg/L
	总氮		UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
	石油类		JLBG-121U 红外分光测油仪/CDJC-YQ-349	0.06mg/L
	动植物油			0.06mg/L
	总砷		AFS-8220 原子荧光光度计/CDJC-YQ-178	3×10 ⁻⁴ mg/L
	总汞			4×10 ⁻⁵ mg/L
	总铅		iCAP 7200 电感耦合等离子体发射光谱仪 /CDJC-YQ-280	0.07mg/L
	总铬			0.03mg/L
	总镉			0.005mg/L
	六价铬		UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.004mg/L
	阴离子表面活性剂		UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
	粪大肠菌群		CSH-400SD 恒温恒湿箱/CDJC-YQ-059	20MPN/L
	烷基汞	甲基汞	GC-2010Pro 气相色谱仪/CDJC-YQ-320	1×10 ⁻⁵ mg/L
		乙基汞		2×10 ⁻⁵ mg/L
地表水	pH		DZB-718 便携式多参数分析仪/CDJC-YQ-268	/
	化学需氧量		HCA-102标准COD消解器/CDJC-YQ-010	4mg/L
	五日生化需氧量		LRH-250A 生化培养箱/CDJC-YQ-009	0.5mg/L
	氨氮		UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.025mg/L

类别	检测项目	使用仪器	检出限
	总磷	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.01mg/L
	总氮	UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
噪声	工业企业厂界噪声	AWA6228-4 多功能声级计/CDJC-YQ-021	25-125dB (A)

8.3 人员能力

参加本次验收监测人员经考核并持有合格证书。

8.4 质量保证与控制

严格按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》规定的质量保证与质量控制相关的要求实施监测，确保监测质量。

(1) 监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

(2) 气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

(3) 在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)的要求进行。采样过程加采 10%的平行样；分析样品按照采样个数的 10%加做平行样，采取带质控样进行分析等一系列质量控制措施，保证监测质量，确保监测数据及结论科学、准确。平行样、质控样结果见表 8-4-1、8-4-2。

(4) 监测数据和报告实行三级审核制度。

表8.4-1 平行样分析结果统计

项目	监测日期	样品编号	测定结果 (mg/L)		相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	结果评价
总磷	3月25日	W2303103-1-2-4	0.06	0.07	7.7	≤10	合格
	3月26日	W2303103-2-2-4	0.08	0.08	0.0	≤10	合格
六价铬	3月25日	W2303104-1-2-4	ND	ND	0	≤10	合格
	3月26日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤10	合格
铅	3月26日	W2303104-2-2-1	ND	ND	0	≤25	合格
	3月26日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤25	合格
镉	3月26日	W2303104-2-2-1	ND	ND	0	≤25	合格
	3月26日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤25	合格

铬	3月26日	W2303104-2-2-1	ND	ND	0	≤25	合格
	3月26日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤25	合格
阴离子表面活性剂	3月25日	W2303104-1-1-1	ND	ND	0	≤10	合格
	3月26日	W2303104-2-1-1	ND	ND	0	≤10	合格
砷	3月25日	W2303104-1-2-4	7×4 ⁻⁴	6×4 ⁻⁴	7.7	≤20	合格
	3月26日	W2303104-2-2-4	6×4 ⁻⁴	7×4 ⁻⁴	7.7	≤20	合格

表8.4-2 质控样分析结果统计表

项目	批号	分析结果	标准值及不确定度	评价结果
总磷	B22040304	0.203mg/L	0.202±0.010mg/L	合格
阴离子表面活性剂	B2208002	4.72mg/L	4.62±0.11mg/L	合格
六价铬	MY-23-005	0.210mg/L	0.205±0.015mg/L	合格
石油类	MY22018 A21120129	10.9mg/L	10.5±0.8mg/L	合格
氨	MY22025 BY400170	0.974	0.970±0.082mg/L	合格

8.5 验收监测期间气象参数

验收监测期间气象参数见表 8-5。

表 8-5 验收监测期间气象参数

日期	天气	风向	气温(°C)	气压(hPa)	风速(m/s)	湿度(%)
2023.3.21	晴	南	24.3	1012.1	2.3	78
2023.3.22	晴	东南	24.2	1012.1	2.1	79

9. 验收监测结果

2023年3月21日~22日，我司对该项目的污染源排放现状实施了现场检测，监测期间，该企业运营正常、稳定，各项环保设施运行正常。

9.1 生产工况

验收监测期间工况见表9-1。

表 9-1 验收监测期间工况分析

日期	设计日废水处理量	实际日废水处理量	工况
2023. 3. 21	750m ³ /d	300m ³ /d	40%
2023. 3. 22	750m ³ /d	300m ³ /d	40%

9.2 污染物排放监测结果

9.2.1 废水监测结果与分析评价

长沙崇德检测科技有限公司于2022年3月21日至3月22日对本项目污水处理厂进、出口进采样监测，废水监测结果见表9.2-1所示。

表9.2-1 废水监测结果

采样点 位	检测项目	采样日期	检测结果					标准限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
污水处 理站进 口	pH（无量纲）	3月21日	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0~7.3	/
		3月22日	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4~7.6	
	悬浮物	3月21日	14	17	18	14	16	/
		3月22日	17	17	19	15	17	
	色度（倍）	3月21日	7	7	6	6	6	/
		3月22日	6	6	4	3	5	
	化学需氧量	3月21日	30	28	30	28	29	/
		3月22日	23	25	25	24	24	
	五日生化需氧量	3月21日	9.8	8.8	8.0	9.3	9.0	/
		3月22日	6.4	7.7	6.5	7.9	7.1	
	氨氮	3月21日	20.8	21.0	20.4	21.0	20.8	/
		3月22日	22.7	21.2	21.7	22.6	22.0	
	总磷	3月21日	2.04	2.10	2.14	2.11	2.10	/
		3月22日	2.06	2.01	2.10	2.03	2.05	
	总氮	3月21日	29.4	28.6	28.7	28.3	28.8	/
		3月22日	31.5	31.9	31.7	32.9	32.0	
	石油类	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	0.06	ND	0.06	ND	0.06	
	动植物油	3月21日	0.31	0.30	0.28	0.29	0.30	/
		3月22日	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	
	总砷	3月21日	2.5×10^{-3}	1.8×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.8×10^{-3}	/
		3月22日	1.7×10^{-3}	1.7×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.7×10^{-3}	1.7×10^{-3}	
	总汞	3月21日	1.25×10^{-3}	1.22×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.25×10^{-3}	/
		3月22日	1.33×10^{-3}	1.32×10^{-3}	1.30×10^{-3}	1.31×10^{-3}	1.32×10^{-3}	
	总铅	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	总铬	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	总镉	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	六价铬	3月21日	0.011	0.009	0.013	0.012	0.011	/

采样点 位	检测项目		采样日期	检测结果					标准限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
			3月22日	0.009	0.010	0.014	0.011	0.011	
	阴离子表面活性剂		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	粪大肠菌群（MPN/L）		3月21日	1.3×10 ⁴	1.2×10 ⁴	1.2×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.2×10 ⁴	/
			3月22日	1.5×10 ⁴	1.5×10 ⁴	1.8×10 ⁴	1.8×10 ⁴	1.6×10 ⁴	
	烷基汞	甲基汞	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
		乙基汞	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	污水处理站出口	pH（无量纲）		3月21日	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2~7.5
3月22日				7.3	7.2	7.3	7.4	7.2~7.4	
悬浮物		3月21日	6	7	6	5	6	20	
		3月22日	5	5	6	6	6		
色度（倍）		3月21日	4	5	5	4	4	30	
		3月22日	4	4	2	2	3		
化学需氧量		3月21日	9	10	11	10	10	60	
		3月22日	7	6	10	8	8		
五日生化需氧量		3月21日	2.4	2.8	2.8	2.8	2.7	20	
		3月22日	2.4	2.6	2.5	2.6	2.5		
氨氮		3月21日	0.110	0.124	0.118	0.121	0.118	8	
		3月22日	0.126	0.132	0.121	0.121	0.125		
总磷		3月21日	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	1	
		3月22日	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02		
总氮		3月21日	1.40	1.39	1.44	1.43	1.41	20	
		3月22日	1.30	1.28	1.26	1.33	1.29		
石油类		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	3	
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND		
动植物油		3月21日	ND	0.06	ND	0.06	0.06	3	
		3月22日	0.06	ND	0.07	0.06	0.06		
总砷		3月21日	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	0.1	
		3月22日	7×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴		
总汞		3月21日	9.0×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴	9.2×10 ⁻⁴	0.001	
		3月22日	9.0×10 ⁻⁴	8.3×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴	8.8×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴		
总铅		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND		
总铬		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND		
总镉		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND		

采样点 位	检测项目	采样日期	检测结果					标准限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
	六价铬	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	阴离子表面活性剂	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	1
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	粪大肠菌群（MPN/L）	3月21日	1.2×10 ³	1.2×10 ³	1.5×10 ³	1.5×10 ³	1.4×10 ³	10 ⁴
		3月22日	1.2×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	1.2×10 ³	1.4×10 ³	
	烷基汞	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	不得检出
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	乙基汞	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	不得检出
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	

备注：参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级B标准和表2标准值。

由表9.2-1可知，验收监测期间，项目出口废水的pH值为7.04~7.05，氨氮浓度日均值为0.118~0.125mg/L，化学需氧量浓度日均值为8~10mg/L，五日生化需氧量浓度日均值为2.5~2.7mg/L，悬浮物浓度日均值为6mg/L，阴离子表面活性剂未检出，石油类未检出、动植物油日均值为0.06mg/L，总氮浓度日均值为1.29~1.41mg/L，总磷浓度日均值为0.02mg/L，粪大肠菌群浓度日均值为1.4×10³个/L，色度日均值为3~4倍，铅、镉、铬未检出，汞浓度日均值为8.9×10⁻⁴~9.2×10⁻⁴mg/L，六价铬浓度未检出，砷浓度日均值为7×10⁻⁴~8×10⁻⁴mg/L，甲基汞、乙基汞未检出。

上述污染物均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

9.2.2 废气监测结果与分析评价

长沙崇德检测科技有限公司于2023年3月21日至3月22日对本项目废气进行采样监测，本次验收监测在项目四周设有4个监测点位，厂内设置一个废气监测点，在上风向选取一个点位作为背景参照，无组织废气监测结果见表9.2-2 所示。

表9.2-2无组织废气监测结果一览表

采样点位	检测项目	采样日期	检测结果			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
东面厂界边界点1#	氨气	3月21日	0.03	0.03	0.03	1.5
		3月22日	0.03	0.03	0.04	
	硫化氢	3月21日	0.006	0.007	0.006	0.06
		3月22日	0.006	0.006	0.007	
	臭气浓度	3月21日	<10	<10	<10	20
		3月22日	<10	<10	<10	
南面厂界边界点2#	氨气	3月21日	0.04	0.04	0.04	1.5
		3月22日	0.04	0.04	0.05	

采样点位	检测项目	采样日期	检测结果			标准 限值
			第一次	第二次	第三次	
	硫化氢	3月21日	0.012	0.011	0.010	0.06
		3月22日	0.010	0.010	0.012	
	臭气浓度	3月21日	<10	<10	<10	20
		3月22日	<10	<10	<10	
西面厂界边界点3#	氨气	3月21日	0.06	0.06	0.07	1.5
		3月22日	0.05	0.05	0.03	
	硫化氢	3月21日	0.013	0.013	0.012	0.06
		3月22日	0.013	0.013	0.013	
	臭气浓度	3月21日	<10	<10	<10	20
		3月22日	<10	<10	<10	
北面厂界边界点4#	氨气	3月21日	0.07	0.07	0.07	1.5
		3月22日	0.06	0.06	0.06	
	硫化氢	3月21日	0.008	0.009	0.009	0.06
		3月22日	0.010	0.010	0.009	
	臭气浓度	3月21日	<10	<10	<10	20
		3月22日	<10	<10	<10	
污水处理站进口	甲烷（以体积浓度%计）	3月21日	2.07×10^{-4}	2.12×10^{-4}	2.14×10^{-4}	1
		3月22日	1.93×10^{-4}	1.97×10^{-4}	2.02×10^{-4}	

备注：参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。

由表9.2-2可知：验收监测期间，该项目厂界无组织废气中硫化氢浓度最大值为0.013mg/m³，氨浓度最大值为0.07mg/m³，臭气浓度最大值为<10(无量纲)，甲烷浓度最高值为 $2.14 \times 10^{-4}\%$ ，以上均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表4中二级标准限值要求。

9.2.3 噪声监测结果与分析评价

项目运行实行全天制，根据噪声源分布情况，在污水处理厂厂区周围共设4个厂界噪声监测点位，监测结果及分析评价见表9.2-3。

表9.2-3 噪声检测结果表

点位序号	采样位置	采样时间	检测结果 dB(A)	
			昼间	夜间
1	东面厂界外1m 1#	3月21日	57.1	49.0
		3月22日	58.7	48.5
2	南面厂界外1m 2#	3月21日	58.0	48.4
		3月22日	57.2	49.2
3	西面厂界外1m 3#	3月21日	57.1	46.9

		3月22日	57.8	47.2
4	北面厂界外1m 4#	3月21日	57.6	48.1
		3月22日	58.0	49.7
标准值			60	50

由表9.2-3可知，验收监测期间，污水处理厂厂界周边噪声监测点位的监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准限值要求。

9.2.4 固（液）体废物

生活垃圾由环卫部门统一清运；格栅渣、沉砂池沉沙、剩余污泥由江华县无害化生活垃圾场进行处置。

9.2.5 污染物排放总量核算

根据验收监测结果，核算该项目主要污染物COD、氨氮排放总量，计算公式：平均排放浓度×年废水排放量×10⁻⁶；本项目废水排放总量为31.025万t/a，其中COD排放浓度均值为8.87mg/L，COD排放总量为2.752t/a，氨氮排放浓度均值为0.121mg/L，氨氮排放总量为0.038t/a，总磷排放浓度均值为0.02mg/L，氨氮排放总量为0.006t/a，总氮排放浓度均值为1.35mg/L，总氮排放总量为0.419t/a，具体见表9.2-4所示。

表9.2-4 项目废水污染物排放总量一览表（t/a）

总量控制指标	验收期间进水日均值浓度（mg/L）	验收期间出水日均值浓度（mg/L）	污染物总产生量（t/a）	自身削减量（t/a）	污染物实际排放量（t/a）	环评控制总量指标（t/a）
COD	26.5	8.22	2.89	5.43	2.79	18.615
氨氮	21.45	0.121	6.65	6.612	0.038	2.48
总磷	1.82	0.02	0.564	0.558	0.006	0.307
总氮	30.3	1.35	9.40	8.981	0.419	6.206

9.2.6 辐射

项目不涉及辐射。

项目环保设施和厂区环境见下图：



污水处理设备一体机



在线监测室



在线监测室设备



紫外消毒

9.3 环境保护设施调试效果

9.3.1 环保设施处理效率监测结果

9.3.1.1 废水治理设施

项目废水治理设施处理效率见表9.3-1。

表9.3-1污水处理工程处理效率

类型	因子	进口浓度(mg/L)	出口浓度 (mg/L)	处理效率 (%)
废水	悬浮物	16	6	62.5
		17	6	64.7
	色度（倍）	6	4	33.3
		5	3	40.0
	化学需氧量	29	10	65.5
		24	8	66.7
	五日生化需氧量	9	2.7	70.0
		7.1	2.5	64.8

	氨氮	20.8	0.118	99.4
		22	0.125	99.4
	总磷	2.1	0.02	99.0
		2.05	0.02	99.0
	总氮	28.8	1.41	95.1
		32	1.29	96.0
	石油类	ND	ND	/
		0.06	ND	100
	动植物油	0.3	0.06	80.0
		0.28	0.06	78.6
	总砷	1.80×10^{-3}	8.00×10^{-4}	55.6
		1.70×10^{-3}	7.00×10^{-4}	58.8
	总汞	1.25×10^{-3}	9.20×10^{-4}	26.4
		1.32×10^{-3}	8.90×10^{-4}	32.6
	总铅	ND	ND	/
		ND	ND	/
	总铬	ND	ND	/
		ND	ND	/
	总镉	ND	ND	/
		ND	ND	/
	六价铬	0.011	ND	100
		0.011	ND	100
	阴离子表面活性剂	ND	ND	/
		ND	ND	/
	粪大肠菌群 (MPN/L)	1.2×10^4	1.4×10^3	88.3
		1.6×10^4	1.4×10^3	91.2
	甲基汞	ND	ND	/
		ND	ND	/
	乙基汞	ND	ND	/
		ND	ND	/

验收监测期间，该废水处理设施处理效率：氨氮处理效率为 99.4%、化学需氧量处理效率为65.5%~67.7%、五日生化需氧量处理效率为64.8%~70.0%，悬浮物(SS)处理效率为62.5%~67.6%，色度处理效率为33.3%~40.0%，总磷(以P计)处理效率99.0%，总氮(以N计)处理效率为95.1%~96.0%，粪大肠菌群处理效率为88.3%~91.2%，汞处理效率为26.4%~32.6%，六价铬处理效率为100%，砷处理效率为55.6%~58.8%，其余因子均未检出，无法测算其处理效率。

9.3.1.2 废气治理设施

项目产生的废气均为无组织排放，通过加强管理、加强厂区绿化、栅渣和污泥及时清运等措施减少废气对周边环境的影响，污泥即产即运，不在厂区堆放。查询环评批复文件及项目设计图纸可知，上述文件未对项目环保设施处理文件作出要求。

9.3.1.3 噪声治理设施

项目通过设备基础减震、墙体隔声等措施来降低噪声，查询环评批复文件及项目设计图纸可知，上述文件未对项目环保设施处理文件作出要求。

9.3.1.4 固（液）体废物治理设施

生活垃圾由环卫部门统一清运；格栅渣、沉砂池沉沙、剩余污泥通过专用垃圾车外运至送永州市南部生活垃圾焚烧发电厂处理处置进行处置。

10. 环境管理检查

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 废水监测结论

验收监测期间，项目污水处理出口废水中的pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群、色度、铅、镉、铬，汞、六价铬、砷、烷基汞浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级B标准和表2标准值。

废水处理设施处理效率：氨氮处理效率为 99.4%、化学需需氧量处理效率为65.5%~67.7%、五日生化需氧量处理效率为64.8%~70.0%，悬浮物(SS)处理效率为62.5%~67.6%，色度处理效率为33.3%~40.0%，总磷(以P计)处理效率99.0%，总氮(以N计)处理效率为95.1%~96.0%，粪大肠菌群处理效率为88.3%~91.2%，汞处理效率为26.4%~32.6%，六价铬处理效率为100%，砷处理效率为55.6%~58.8%，其余因子均未检出，无法测算其处理效率。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，该项目厂界无组织废气中硫化氢浓度最大值、氨浓度最大值、臭气浓度最大值、甲烷浓度百分比最大值符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及其修改单表4中二级标准限值要求。

10.1.3 噪声监测结论

验收监测期间，污水处理厂厂界周边噪声监测点位的监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准限值要求。

10.1.4 固体废物处置情况结论

生活垃圾由环卫部门统一清运；格栅渣、沉砂池沉沙、剩余污泥通过专用垃圾车外运至送永州市南部生活垃圾焚烧发电厂处理处置进行处置。

10.1.5 环境管理检查情况

已执行了建设项目环境保护的管理规定，有专人负责环保现场管理，负责对废气处理设施的管理，安排了设备检修人员对环保设备进行维护。落实了环评批复的要求，制定了环保管理制度，建设制定环境风险应急预案。

10.2 总体结论

固体废物得到妥善处置，验收监测期间该工程各项污染因子的监测数据均达标，环保设施运转正常，均符合环评、环评批复及相关环境管理要求，

10.3 验收监测建议

(1) 必须认真落实环境管理制度、承担安全管理责任。

(2) 严格按照固废收集、存储处置的技术规范，综合利用和安全处置各类固体废弃物

(3) 加强环境风险应急管理，按照所制定的环境风险应急预案，开展应急演练。做到事故发生时能在第一时间向各有关部门做出预报预警情况汇报，以便采取有利的措施防止下游水质受到污染。

(4) 自觉接受当地环境管理部门管理。污水处理设施的维护、维修，应及时报告当地环境管理部门。

11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)竣工环境保护验收报告						项目代码				建设地点	湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇		
	行业类别（分类管理名录）	D4620 污水处理及其再生利用						建设性质	☒ 新建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造			项目厂区中心经纬度	N：24°50'47.24"，E：111°30'16.99"		
	设计生产能力	西：100m³/d、南：750m³/d						实际生产能力	750m³/d			环评单位	北京国环益达环保技术有限公司		
	环评文件审批机关	永州市生态环境局						审批文号	江环评字[2020]17号			环评文件类型	报告表		
	开工日期	2021年1月						竣工日期	2022年11月			排污许可证申领时间	2023年4月15日		
	环保设施设计单位	江华冯乘发展集团有限公司						环保设施施工单位	湖南省天宇建设集团有限公司			本工程排污许可证编号	91431129753350195N06Q		
	验收单位	长沙崇德检测科技有限公司						环保设施监测单位	长沙崇德检测科技有限公司			验收监测时工况	40%		
	投资总概算（万元）	1827.29						环保投资总概算（万元）	93			所占比例（%）	5.1		
	实际总投资（万元）	1371.16						实际环保投资（万元）	75			所占比例（%）	4.47		
	废水治理（万元）	5	废气治理（万元）	20	噪声治理（万元）	25	固体废物治理（万元）	15			绿化及生态（万元）	10	其他（万元）		
新增废水处理设施能力							新增废气处理设施能力				年平均工作时	8760			
运营单位	江华冯乘发展集团有限公司						运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	91431129753350195N			验收时间	2023年3月21日~3月22日			
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)		
	废水	0	0	0	31.025	0	0	0	0	0	0	0	0		
	COD	0	8.22	60	2.79	0	2.79	18.615	0	2.79	18.615	0	+2.79		
	NH ₃ -N	0	0.121	15	0.038	0	0.038	2.48	0	0.038	2.48	0	+0.038		
	总磷	0	0.02	1	0.006	0	0.006	0.307	0	0.006	0.307	0	+0.006		
	总氮	0	1.35	20	0.419	0	0.419	6.206	0	0.419	6.206	0	+0.419		
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘														
	氮氧化物														
	工业固体废物														

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升

永州市生态环境局文件

江环评字[2020]17号

关于江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网 建设项目（涛圩镇）环境影响报告表的批复

江华瑶族自治县城市建设投资开发有限公司：

你单位委托北京国环益达环保技术有限公司编制的《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目（涛圩镇）环境影响报告表》和审批请示已收悉，经我局审查后，现批复如下：

一、本建设工程项目位于江华瑶族自治县涛圩镇，建设处理规模分别为 100m³/d（西区污水处理厂）、750m³/d（南区污水处理厂）的污水处理厂 2 座，配套污水收集管网 10099 米。西区污水处理厂位于涛圩中学西侧，地理位置坐标：N：24° 50'47.24"，E：111° 30'16.99"；南区污水处理厂位于涛圩镇上晒田村西侧，地理位置坐标：N：24° 50'29.38"，E：111° 29'42.72"。总投资 1827.29 万元，总用地面积 972.4m²（具体建设地点以规划用地红线图为准），配套管网长 10099 米，主要建设内容有：格栅调节池、提升泵房、A2/O 生物接触氧化一体化设备、紫外消毒一体化设备、在线监测室、

计量渠。污水处理工艺采用格栅-沉砂池+调节池+生物一体化处理装置（A2/O）+紫外线消毒处理，设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。该项目本身是一项环保治理工程，符合国家产业政策。根据环境影响报告表的分析结论和审查意见，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意涛圩镇污水处理厂及配套管网建设项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护措施建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、落实施工期各项污染防治措施。配套的排水管网工程，须科学设计和施工，避免产生的塌陷等地质环境问题；合理安排各类施工机械的工作时间，并选用低噪声设备和采取降噪、减振、消声等措施，减少噪声对周边环境的影响；加强对施工路线附近环境敏感点的保护，防止噪声扰民；建筑材料堆放场、施工场地必须采取环保措施防止暴雨径流引起水体污染；开挖过程中产生的土石方及时回填，严禁随意堆洒，以避免造成水土流失和城市下水道淤塞；避免因施工

方式不当破坏城市美观，采取有效措施防止因工程施工对民众出行等日常活动造成不良影响。

2、出水水质必须稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 B 标准，排入西河。废水排放量 31.025 万吨，主要污染物预测年排放为：COD 为 18.615t/a，NH₃-H 为 2.48t/a，总磷 0.307t/a，总氮 6.206t/a。

3、所选用的设备、环保设施符合国家产业政策及质量安全要求。按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-95)的规定，设置国家环保部统一的环境保护图形标志牌。应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

4、污水处理厂设置的卫生防护距离范围内，不宜规划、建设学校、医院、民用住宅等敏感建筑和对环境空气质量要求高的项目，建设方应协助当地政府做好上述工作。项目需采用严格的污染防治措施，特别是对产生臭味大的点位应采取密封、集中处理等措施，减少无组织排放量。在采取严格的治理措施的前提下，加强对厂界及周边环境的恶臭监测，防止超标和影响周边群众生活。

5、建立风险事故防范与应急预案，防止污水处理厂因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放对河水水质产生影响。在纳污河段枯水季节时，要采取有效措施，防止非正常排放对其产生污染。

6、强化生态保护和水土保持措施，加强对施工期结束后的生态恢复，防止水土流失和生态破坏。

7、生活垃圾严格按照环卫部门的有关要求进行处理。对污泥进行脱水处理，脱水后的污泥含水率满足国家相关标准，通过专用垃圾车外运至江华县无害化生活垃圾场进行安全卫生填埋处置。

8、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好本项目与周边的关系，项目建设、运营须采取有效措施，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐报，如有隐瞒、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、我局将按照建设项目环境保护管理规定加强对该项目建设情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。工程在建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。竣工后，要按照国家相关法规要求自主开展环境保护竣工验收,通过验收合格后，项目方可正式投入运行。

永州市生态环境局

2020年10月26日



附件2 排污许可证申领情况

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂（涛圩镇）

生产经营场所地址：湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇 行业类别：污水处理及其再生利用 所在地区：湖南省-永州市-江华瑶族自治县 发证机关：永州市生态环境局

[排污许可证正本](#)
[排污许可证副本](#)



许可证编号	业务类型	版本	办结日期	有效期限
91431129753350195N006Q	申领	1	2023-04-15	2023-04-15 至 2028-04-14

 大气污染物排放信息

 水污染物排放信息

 自行监测要求

 执行（守法）报告要求

 信息公开要求

 环境管理台账记录要求

 其他许可内容

附件3 污泥委托处置合同

永州市南部生活垃圾焚烧发电厂
污泥处置合同

甲方：永州市南部生活垃圾焚烧发电厂

乙方：江华冯乘发展集团有限公司

永州市南部生活垃圾焚烧发电厂的污泥处置及所产生的其他垃圾处置符合国家有关规定和环保要求。经甲、乙双方协商，现就有关事项约定如下：

一、根据相关要求和规范，乙方在处理污水过程中所产生的污泥及相关垃圾，统一集中运送到甲方的无害化垃圾焚烧发电厂进行处理，服从甲方的有序管理。

二、乙方运送至无害化垃圾场的污泥必须遵照国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（GJJ60-94）相关规定执行。

三、乙方将污泥及相关垃圾运输到甲方指定场所，运输由乙方负责，甲方接受乙方的污泥及相关垃圾，按 200 元/吨收取处置费用。

四、若乙方未按要求处置污泥，导致不符合上述国家相关污泥处置标准的污泥出厂，造成的环境污染等后果和损失概由乙方承担。

五、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

六、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

联系电话：



乙方：

联系电话：





崇德检测 (2023) 测字第 03-104 号

检测报告

项目名称: 江华瑶族自治县濠圩污水处理厂及管网工程

项目验收监测

委托单位: 江华瑶族自治县濠圩污水处理厂

长沙崇德检测科技有限公司

二〇二三年四月三日

报告编制说明

- 1、报告无本公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效；
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚涂改、无审核/签发者无效；
- 3、未经本公司书面同意，不得部分复印本报告；
- 4、委托方如对检测报告结果有异议，收到本检测报告之日起十日内向本公司提出；
- 5、本报告仅对本次检测样品负责；
- 6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责；
- 7、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

地址：湖南省长沙市岳麓西大道 2450 号节能环保产业园 A2 栋 12 、13 楼

电话：0731-89878596、0731-89878597

传真：0731-84429648

邮编：410000



一、基本信息

表 1 检测任务基本信息

项目名称	江华瑶族自治县涛圩污水处理厂及管网工程项目验收监测		
项目地址	湖南省永州市江华瑶族自治县		
采样人员	肖哲、刘宏达、向英杰	采样日期	2023.3.21~3.22
分析人员	肖哲、刘宏达、向英杰、徐妍璐、蔡澳、李龙、苏思荣、向叶平、肖凤、张豪	分析日期	2023.3.21~3.31
检测类别	委托检测		
采样方法	1、无组织废气：HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》、GB/T 14675-1993《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 2、废水：HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》 3、噪声：GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》		
备注	1、参考标准由委托方提供 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：当检测结果低于检出限时，用“ND”表示。		

二、+检测内容

表 2 检测内容

类别	采样点位	点位数	检测项目	样品状态	检测频次
无组织 废气	东面厂界边界点 1#	5	氨气、硫化氢、臭气浓度	/	3 次/天， 2 天
	南面厂界边界点 2#				
	西面厂界边界点 3#				
	北面厂界边界点 4#				
	污水处理站进水口		甲烷		
废水	污水处理站进口	2	pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、六价铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、烷基汞	微黄色、有异味、较浑浊、有明显浮油	4 次/天， 2 天
	污水处理站出口			无色、无异味、清澈、无明显浮油	
噪声	东面厂界边界处 1m1#	4	工业企业厂界噪声	/	昼夜各监

类别	采样点位	点位数	检测项目	样品状态	检测频次
	南面厂界边界处 1m2#				测1次, 2天
	西面厂界边界处 1m3#				
	北面厂界边界处 1m4#				

三、检测方法和使用仪器

表 3 检测方法和使用仪器

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
无组织 废气	氨气	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	722 可见分光光度计 /CDJC-YQ-002	0.01mg/m ³
	硫化氢	《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》GB/T 11742-1989	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.005mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	/
	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC7900 气相色谱 (非甲烷总烃测试仪) /CDJC-YQ-064	0.06mg/m ³
废水	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-718 便携式多参数分析仪/CDJC-YQ-268	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	BSA224S 型电子天平/ CDJC-YQ-012	4mg/L
	色度	稀释倍数法《水质 色度的测定》 HJ 1182-2021	/	2 倍
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	HCA-102 标准 COD 消解器/CDJC-YQ-010	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	LRH-250A 生化培养箱 /CDJC-YQ-009	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.01mg/L

类别	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U 红外分光测油仪/CDJC-YQ-349	0.06mg/L
	动植物油			0.06mg/L
	总砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计/CDJC-YQ-178	3×10^{-4} mg/L
	总汞			4×10^{-5} mg/L
	总铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	iCAP 7200 电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280	0.07mg/L
	总铬			0.03mg/L
	总镉			0.005mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-1987	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.004mg/L
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987	UV-2600 紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004	0.05mg/L
	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	CSH-400SD 恒温恒湿箱/CDJC-YQ-059	20MPN/L
	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993	GC-2010Pro 气相色谱仪/CDJC-YQ-320	1×10^{-5} mg/L
				2×10^{-5} mg/L
噪声	工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	AWA6228-4 多功能声级计/CDJC-YQ-021	25-125dB (A)

四、气象参数

表 4 采样期间气象参数

日期	天气状况	温度 (°C)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	气压 (kPa)
3 月 21 日	晴	24.3	78	南	2.3	101.21
3 月 22 日	晴	24.2	79	东南	2.1	101.21

五、检测结果

表 5 无组织废气检测结果

单位: mg/m^3

采样点位	检测项目	采样日期	检测结果			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
东面厂界边界点 1#	氨气	3 月 21 日	0.03	0.03	0.03	1.5
		3 月 22 日	0.03	0.03	0.04	
	硫化氢	3 月 21 日	0.006	0.007	0.006	0.06
		3 月 22 日	0.006	0.006	0.007	
	臭气浓度	3 月 21 日	<10	<10	<10	20
		3 月 22 日	<10	<10	<10	
南面厂界边界点 2#	氨气	3 月 21 日	0.04	0.04	0.04	1.5
		3 月 22 日	0.04	0.04	0.05	
	硫化氢	3 月 21 日	0.012	0.011	0.010	0.06
		3 月 22 日	0.010	0.010	0.012	
	臭气浓度	3 月 21 日	<10	<10	<10	20
		3 月 22 日	<10	<10	<10	
西面厂界边界点 3#	氨气	3 月 21 日	0.06	0.06	0.07	1.5
		3 月 22 日	0.05	0.05	0.03	
	硫化氢	3 月 21 日	0.013	0.013	0.012	0.06
		3 月 22 日	0.013	0.013	0.013	
	臭气浓度	3 月 21 日	<10	<10	<10	20
		3 月 22 日	<10	<10	<10	
北面厂界边界点 4#	氨气	3 月 21 日	0.07	0.07	0.07	1.5
		3 月 22 日	0.06	0.06	0.06	
	硫化氢	3 月 21 日	0.008	0.009	0.009	0.06
		3 月 22 日	0.010	0.010	0.009	
	臭气浓度	3 月 21 日	<10	<10	<10	20
		3 月 22 日	<10	<10	<10	
污水处理站进口	甲烷 (以体积浓度%计)	3 月 21 日	2.07×10^{-4}	2.12×10^{-4}	2.14×10^{-4}	1
		3 月 22 日	1.93×10^{-4}	1.97×10^{-4}	2.02×10^{-4}	

备注: 参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表 4 二级标准。

表 6 废水检测结果

单位: mg/L

采样点位	检测项目	采样日期	检测结果					标准限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
污水处	pH (无量纲)	3 月 21 日	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0~7.3	/
		3 月 22 日	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4~7.6	

采样点 位	检测项目	采样日期	检测结果					标准限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
理站进 口	悬浮物	3月21日	14	17	18	14	16	/
		3月22日	17	17	19	15	17	
	色度 (倍)	3月21日	7	7	6	6	6	/
		3月22日	6	6	4	3	5	
	化学需氧量	3月21日	30	28	30	28	29	/
		3月22日	23	25	25	24	24	
	五日生化需氧量	3月21日	9.8	8.8	8.0	9.3	9.0	/
		3月22日	6.4	7.7	6.5	7.9	7.1	
	氨氮	3月21日	20.8	21.0	20.4	21.0	20.8	/
		3月22日	22.7	21.2	21.7	22.6	22.0	
	总磷	3月21日	2.04	2.10	2.14	2.11	2.10	/
		3月22日	2.06	2.01	2.10	2.03	2.05	
	总氮	3月21日	29.4	28.6	28.7	28.3	28.8	/
		3月22日	31.5	31.9	31.7	32.9	32.0	
	石油类	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	0.06	ND	0.06	ND	0.06	
	动植物油	3月21日	0.31	0.30	0.28	0.29	0.30	/
		3月22日	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	
	总砷	3月21日	2.5×10^{-3}	1.8×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.8×10^{-3}	/
		3月22日	1.7×10^{-3}	1.7×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.7×10^{-3}	1.7×10^{-3}	
	总汞	3月21日	1.25×10^{-3}	1.22×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.25×10^{-3}	/
		3月22日	1.33×10^{-3}	1.32×10^{-3}	1.30×10^{-3}	1.31×10^{-3}	1.32×10^{-3}	
	总铅	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	总铬	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	总镉	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	六价铬	3月21日	0.011	0.009	0.013	0.012	0.011	/
		3月22日	0.009	0.010	0.014	0.011	0.011	
	阴离子表面活性剂	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
		3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	粪大肠菌群	3月21日	1.3×10^4	1.2×10^4	1.2×10^4	1.3×10^4	1.2×10^4	/

采样点 位	检测项目		采样日期	检测结果					标准限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
	(MPN/L)		3月22日	1.5×10 ⁴	1.5×10 ⁴	1.8×10 ⁴	1.8×10 ⁴	1.6×10 ⁴	
	烷基汞	甲基汞	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
		乙基汞	3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	/
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
污水处理站出口	pH（无量纲）		3月21日	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2~7.5	6-9
			3月22日	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2~7.4	
	悬浮物		3月21日	6	7	6	5	6	20
			3月22日	5	5	6	6	6	
	色度（倍）		3月21日	4	5	5	4	4	30
			3月22日	4	4	2	2	3	
	化学需氧量		3月21日	9	10	11	10	10	60
			3月22日	7	6	10	8	8	
	五日生化需氧量		3月21日	2.4	2.8	2.8	2.8	2.7	20
			3月22日	2.4	2.6	2.5	2.6	2.5	
	氨氮		3月21日	0.110	0.124	0.118	0.121	0.118	8
			3月22日	0.126	0.132	0.121	0.121	0.125	
	总磷		3月21日	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	1
			3月22日	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
	总氮		3月21日	1.40	1.39	1.44	1.43	1.41	20
			3月22日	1.30	1.28	1.26	1.33	1.29	
	石油类		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	3
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	动植物油		3月21日	ND	0.06	ND	0.06	0.06	3
			3月22日	0.06	ND	0.07	0.06	0.06	
	总砷		3月21日	9×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	0.1
			3月22日	7×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	
	总汞		3月21日	9.0×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴	9.2×10 ⁻⁴	0.001
			3月22日	9.0×10 ⁻⁴	8.3×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴	8.8×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴	
	总铅		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	总铬		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
			3月22日	ND	ND	ND	ND	ND	
	总镉		3月21日	ND	ND	ND	ND	ND	0.01

采样点 位	检测项目	采样日期	检测结果					标准限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
	六价铬	3 月 22 日	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
		3 月 21 日	ND	ND	ND	ND	ND	
		3 月 22 日	ND	ND	ND	ND	ND	
	阴离子表面活性剂	3 月 21 日	ND	ND	ND	ND	ND	1
		3 月 22 日	ND	ND	ND	ND	ND	
	粪大肠菌群 (MPN/L)	3 月 21 日	1.2×10 ³	1.2×10 ³	1.5×10 ³	1.5×10 ³	1.4×10 ³	10 ⁴
		3 月 22 日	1.2×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	1.2×10 ³	1.4×10 ³	
	烷基汞	3 月 21 日	ND	ND	ND	ND	ND	不得检出
		3 月 22 日	ND	ND	ND	ND	ND	
		3 月 21 日	ND	ND	ND	ND	ND	不得检出
		3 月 22 日	ND	ND	ND	ND	ND	

备注：参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 B 标准和表 2 标准值。

表 7 厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

监测日期	监测点位	监测结果	
		昼间	夜间
3 月 21 日	东面厂界边界处 1m1#	57.1	49.0
	南面厂界边界处 1m2#	58.0	48.4
	西面厂界边界处 1m3#	57.1	46.9
	北面厂界边界处 1m4#	57.6	48.1
3 月 22 日	东面厂界边界处 1m1#	58.7	48.5
	南面厂界边界处 1m2#	57.2	49.2
	西面厂界边界处 1m3#	57.8	47.2
	北面厂界边界处 1m4#	58.0	49.7
标准限值	2 类标准	60	50

备注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准，其中南界参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类限值。

表 8 平行样分析结果统计

项目	监测日期	样品编号	测定结果 (mg/L)		相对偏差 (%)	允许相对偏 差 (%)	结果 评价
总磷	3 月 21 日	W2303103-1-2-4	0.06	0.07	7.7	≤10	合格
	3 月 22 日	W2303103-2-2-4	0.08	0.08	0.0	≤10	合格
六价铬	3 月 21 日	W2303104-1-2-4	ND	ND	0	≤10	合格

	3 月 22 日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤10	合格
铅	3 月 22 日	W2303104-2-2-1	ND	ND	0	≤25	合格
	3 月 22 日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤25	合格
镉	3 月 22 日	W2303104-2-2-1	ND	ND	0	≤25	合格
	3 月 22 日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤25	合格
铬	3 月 22 日	W2303104-2-2-1	ND	ND	0	≤25	合格
	3 月 22 日	W2303104-2-2-4	ND	ND	0	≤25	合格
阴离子表面活性剂	3 月 21 日	W2303104-1-1-1	ND	ND	0	≤10	合格
	3 月 22 日	W2303104-2-1-1	ND	ND	0	≤10	合格
砷	3 月 21 日	W2303104-1-2-4	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	7.7	≤20	合格
	3 月 22 日	W2303104-2-2-4	6×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	7.7	≤20	合格

表 9 质控样分析结果统计表

项目	批号	分析结果	标准值及不确定度	评价结果
总磷	B22040304	0.203mg/L	0.202±0.010mg/L	合格
阴离子表面活性剂	B2208002	4.72mg/L	4.62±0.11mg/L	合格
六价铬	B22080111	0.210mg/L	0.205±0.015mg/L	合格
石油类	A21120129	10.9mg/L	10.5±0.8mg/L	合格
氨	B21060258	0.974	0.970±0.082mg/L	合格

以下空白

-----报告结束-----


编制: 毛佳

审核: 彭金意

签发: 刘少平

签发日期: 2023.8.3

采样照片

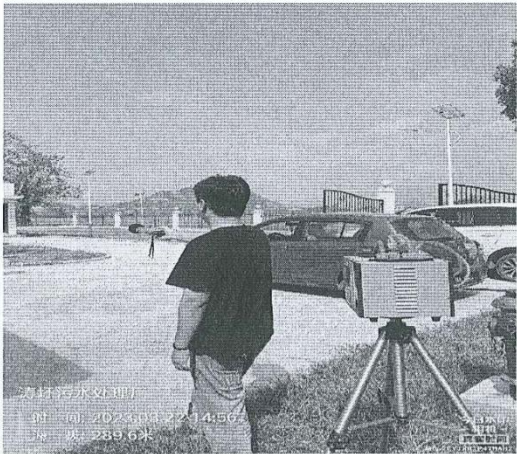

附件5 自查报告

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网 建设项目（涛圩镇）竣工环境保护验收企业自查报告

1.环保手续履行情况

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目（涛圩镇），建设性质为新建项目。项目于 2021 年 1 月正式开工建设，于 2022 年 11 月完成建设，投入试运行。本项目环境影响评价于 2020 年 10 月获永州市生态环境局批复（江环评字[2020]17 号）。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，所属行业已纳入排污许可管理，项目已申领排污许可证，证书编号为 91431129753350195N06Q。

2.项目建成情况

2.1 项目建设情况

项目建设情况见表 2-1。

表 2-1 建设项目情况

项目名称	江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目 (涛圩镇)				
建设单位名称	江华冯乘发展集团有限公司				
建设地点	湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇				
建设性质	新建				
行业类别	D4620 污水处理及其再生利用				
建设规模	新建 750m³/d 的污水处理厂 1 座				
工程主要建设内容	格栅调节池、提升泵房、A²/O 生物接触氧化一体化设备、紫外消毒一体化设备、在线监测室计量渠				
实际占地面积	771.4m²		实际绿化面积		466.0m²
法人代表	杨晴华	联系人	李江松		联系方式 13789237880
开建时间	2021 年 3 月		竣工日期	2022 年 11 月	调试时间 2023 年 3 月
总投资 (环评)	1827.29 万	环保投资 (环评)		93 万	所占比例 5.1%
总投资 (实际)	1371.16 万	环保投资 (实际)		75 万	所占比例 5.47%
年工作时间	每年工作 365 天，每天 24 小时			职工人数 3 人	
环保处理设计单位	华南设计集团有限公司				
环保设施施工单位	湖南省天宇建设工程有限公司				
环评情况	2020 年 9 月，北京国环益达环保技术有限公司编制《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网 建设项目 (涛圩镇)环境影响报告表》				

批复情况	2020 年 10 月 26 日,《关于江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网 建设项目 (涛圩镇)环境影响报告表的批复》江环评字[2020]17 号批复
工程实际情况	实际运营、主体工程及环保设施运行情况正常

2.2 工程建设内容

项目主要建设内容见表 2.2-1、主要设备及建筑物情况见表 2.2-2。

表 2.2-1 环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

类别	工程名称	环评及批复工程内容	实际建设内容	备注
主体工程	污水处理厂	格栅/调节池/A ² /O 一体化设备一座设计流量 100m ³ /天的污水处理厂、一座设计流量 750m ³ /天的污水处理厂	格栅/调节池/A ² /O 一体化设备一座设计流量 750m ³ /天的污水处理厂	变动
	污水管网	污水收集管 10099m	污水收集管 2489m	变动
辅助工程	紫外线消毒计量渠	/	无紫外消毒池,紫外消毒器位于一体化设备中	变动
配套工程	在线监测室	/	面积 18.2m ²	一致
公用工程	给水	涛圩镇给水管网	涛圩镇给水管网	一致
	排水	采用雨污分流制,雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟,厂区污水用管道收集后排入污水厂粗格栅前,再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河。	采用雨污分流制,雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟,厂区污水用管道收集后排入污水厂粗格栅前,再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河。	一致
	供电	市政供电	市政供电	一致
环保措施	废水	采用雨污分流制。雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等污水自成系统,用管道收集后排入污水厂粗格栅前,再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河。	采用雨污分流制。雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等污水自成系统,用管道收集后排入污水厂粗格栅前,再提升进入污水处理系统处理。处理达标的尾水排入西河。	一致
	废气	设置绿化隔离带,厂区臭气源采用封闭方式,对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理等	设置绿化隔离带,厂区臭气源采用封闭方式,对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理等	一致
	噪声	采用低噪设备、对设备间进行隔声处理	采用低噪设备、对设备间进行隔声处理	一致
	固废	格栅渣、沉砂池,运至垃圾填埋场填埋	污泥脱水处理后,再通过专用垃圾车外运至江华县无害化生活垃圾场进行处置。	一致
		污泥,运至垃圾填埋场填埋		一致
		生活垃圾,环卫部门处置	生活垃圾,环卫部门处置	一致

表 2.2-2 主要设备及建筑物一览表

类别	建设规模及组成（环评）	实际建设内容	备注
粗细格栅	格栅池净尺寸：L×B×H=1.0m×5.0m×4.0m	①主要设备配置：水力机械细格栅筛：1 台	环评初期未具体细化，实际建设设备有细微变化，整体内容一致
调节池及污泥池	调节池净尺寸：L×B×H=14.5m×5.0m×4.0m 污泥池净尺寸：L×B×H=5.0m×5.0m×4.0m	①有效容积：720m ³ 构筑物：调节池平面尺寸：B×L×H=20.0×9.0×4.0（m），1 座，②主要设备配置：潜污泵：2 台，一用一备，Q=165m ³ /h，H=12m，N=11kW，配自耦及起吊装置；高速潜水搅拌机：2 台，Φ325，n=720rpm，N=2.2kW，配起吊装置；手动葫芦：1 台，T=0.5t，仓库冷备；潜污泵：1 台，Q=15m ³ /h，H=13m，N=1.1kW。	
A2/O 一体化设备	一体化污水处理系统：工艺 A' O 污水处理系统设计流量：100 吨/天 一体化污水处理系统：工艺 A' O 污水处理系统设计流量：750 吨/天	①设计流量：Q=750m ³ /d； ②构筑物：AAO 生化池：1 座 3 组，尺寸 B×L×H=3.2×18.0×3.2(m) ③主要设备配置：设备总装机功率：28.15KW；	
一体化提升泵站	无具体信息	①构筑物：尺寸 B×L×H=2.3×2.3×0.5(m)， ②主要设备配置：潜污泵：3 台，Q=40m ³ /h，H=12m，N=3.7kW。	
紫外消毒及计量槽	无具体信息	①构筑物：紫外消毒池：1 座，尺寸 L×B×H=5.0×3.6×1.9（m）； 巴氏计量槽：1 座，尺寸 L×B×H=7.5×0.5×1.4（m）； ②主要设备配置：管式紫外消毒设备：1 套，Q=100m ³ /h，配套 155W 紫外灯管 12 支及镇流器、控制系统、自动清洗系统等，整套装置总功率 1.86kW； 巴氏计量槽：1 台，计量范围 1.5-100L/s。	
在线监测室	无具体信息	建筑面积：18.2m ² 。	
综合管理用房	无具体信息	建筑面积：57.2m ²	
备注	项目实际建设只建设了一座设计流量：750 吨/天的污水处理厂		

2.3 主要原辅材料及消耗

项目主要原辅材料情况见表 2.3-1。

表 2.3-1 项目主要原辅材料情况

序号	原辅材料名称	环评预计年消耗量（t/a）	实际年消耗量（t/a）
1	PAC	/	7
2	PAM	/	1.4
3	水	/	3
4	电	/	3.5 万度

2.4 工艺流程

江华县涛圩镇污水处理厂建设工程项目预处理工艺采用粗细格栅、提升泵站、调节池；生物处理工艺采用 A²/O 一体化设备；出水消毒 工艺采用紫外消毒法。项目生产工艺流程及产污环节如图 2.4-1 所示。




图 2.4-1 污水处理厂运营工艺流程图

3. 环境保护设施建设情况

3.1 建设过程

工程建设总投资费用 1371.16 万元，其中环保投为 75 万元，占总投资的 5.47%。主要环保设施见表 3-1。

表 3-1 建设项目环保投资一览表

时段	项目		环保措施	环保投资(万元)	备注
施工期	废气	施工扬尘	围挡、洒水降尘、加盖篷布、车辆过水池	10	
	噪声	施工设备	采用低噪声设备、管网施工建立隔声障等	5	
	固废	生活垃圾、建筑垃圾	生活垃圾、建筑垃圾、收集，交当地环卫部门妥善处理	6	
	生态环境		水土流失防治、生态恢复	10	
运营期	废气	恶臭	厂区绿化	10	
	噪声	设备噪声	采用低噪产品、对设备间进行隔声处理	10	
			西区污水处理厂南、北面设置隔声墙	10	
	固废	生产固废、生活固废	栅渣、沉砂、污泥运输和处置，设置垃圾桶	9	
	尾水监测		在线监测仪器	5	
	合计			75	

3.2 污染物治理/处置设施

3.2.1 废水

本项目废水来源于：涛圩镇镇区范围内的居民生活污水、厂区生活污水。废水排放及其处理设施见表 3.2-1。

表 3.2-1 废水排放及其处理设施

类型	产污环节	主要污染因子	产生规律	处置方式及设施	外排方式
服务区废水	服务范围内生活污水	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、总氮、总磷等	连续	采用“格栅-沉砂池+调节池+生物一体化处理装置(A2/O)+紫外线消毒处理”处理工艺处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 B 标准后经管道排放至西河。	间接排放

厂区生活污水	值班生活	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、总氮、总磷等	间歇	进入本污水处理厂处理	间接排放
--------	------	--	----	------------	------

3.2.2 废气

营运期产生的废气主要为污水处理厂恶臭气体、检查井井盖挥发出来的少量恶臭气体及备用柴油发电机废气。

废气排放及其处理见表 3.2-2。

表 3.2-2 废气排放及其处理

产污环节	主要污染因子	处置方式	产生规律	外排方式
污水处理工艺	氨、硫化氢、臭气浓度	采取密闭,减少无组织排放	连续	无组织排放
柴油发电机废气	CO、烟尘等	自然通风	间歇	无组织排放

3.2.3 噪声

本项目噪声污染源强及措施详见表 3.2-3。

表 3.2-3 噪声污染源分析及治理措施一览表

序号	设备名称	数量	噪声源位置	源强	备注
1	提升泵	2 台	污水泵房	75	持续
2	搅拌机	4 台	调节池	75	持续
3	鼓风机	1 台	一体化处理设备	80	持续
4	加药泵	4 台	加药间	75	持续

3.2.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、污水处理厂栅渣和污泥、废药剂包装袋及废紫外线灯管。

项目固体废物产生及处置方式如下。

表 3.2-4 固体废弃物增加量及处置方式

序号	固体废物名称	属性	产生量 (t/a)	处置方式
1	生活垃圾	一般固废	20	环卫部门统一清运
2	格栅渣	一般固废	27.375	通过专用垃圾车外运至永州市南部生活垃圾焚烧发电厂处理处置进
3	污泥	一般固废	78.46	

				行处置。
4	废药剂包装袋	一般固废	0.035	废包装袋集中收集交由生产厂家回收处理
5	废弃紫外灯管	危废固废	6 支	项目才开始运行还未产生，后续运行中产生后集中收集交由有资质单位处理。

3.3 其他环境保护设施

3.3.1 环境风险防范设施

项目已设置危废暂存间对危废进行暂存，危废分类存放，下设防漏托盘。

3.3.2 规范化排污口

项目已按规范要求，项目只设置一个污水排口，已设立标识标牌。

3.3.3 其他设施

无。

3.3.4 整改情况

项目已落实环境影响报告书及其审批部门审批决定要求的环境保护设施，无需整改。

3.3.5 设备变动情况

无

3.4 重大变动情况

通过项目工程建设内容与项目环评及环评批复内容对比，本次验收对象的主体工程等各项建设指标没有变化，项目产排污情况及配套的环保设施与批复一致，无重大工程变动情况。

承诺：

我公司郑重承诺，以上所填报内容全部属实。如存在瞒报、假报等情况，由此而导致的一切后果由我公司承担。

填报人（签名）

公司名称（盖章）



附件6 其他事项说明

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

已将环境保护设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目验收工作 2023 年 3 月启动，委托长沙崇德检测科技有限公司负责该项目的竣工环境保护验收监测工作。长沙崇德检测技术有限公司组织相关技术人员对验收项目进行了现场勘察，经现场勘察及环境管理初步检查，目前生产及环保设施运行状况正常。于 2023 年 3 月 21 日至 3 月 22 日，长沙崇德检测科技有限公司对项目的污染源排放状况实施了连续两天的现场监测，收集核实了有关资料，在此基础上编制本验收报告。报告于 2023 年 4 月 18 日完成编制，拟邀请环保局及专家领导、验收检测单位在我司办公楼内召开了自主验收会议。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

序号	环保管理制度主要内容	检查情况
1	安全环境生产领导小组组织机构图	已落实
2	建设项目的环境管理	已落实
3	大气污染防治管理办法	已落实
4	水污染防治管理办法	已落实
5	固体废物管理办法	已落实
6	环境污染事故管理办法	已落实

(2) 环境风险防范措施

已同步制定环境风险应急预案，明确区域应急联动方案，并要求按照预案进行过演练。

(3) 环境监测计划

（3）环境监测计划

该企业根据项目环境影响报告表及审批部门审批决定中的重点污染监控项目，制定了环境监测计划，各项污染因子的监测数据均达标，环保设施运转正常，基本能达到环评及审批部门审批要求。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目不涉及到区域内削减污染物总量和淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

该项目为已建项目，不涉及到防护距离及居民搬迁问题。

2.3 其他措施落实情况

无。

3. 整改工作情况

（1）已定期对污染控制设施设备、收集系统进行维护。保养。检修，并建立日常运行台账，确保污染控制设施正常运行，并依法依规定期监测。

（2）完善危废台账管理

附件7 环境保护制度

环境管理制度

为规范污水厂内部环境管理机构 and 制度建设，通过建立环境管理组织架构和规范环境管理条例，全面提高污水厂的自主环境管理水平，特编制本环境管理制度。

一、编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》第二十四条：“产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度”；

2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目环境保护设计规定》、《污染源自动监控管理办法》、《环境统计管理办法》、《排放污染物申报登记管理规定》等有关设立环境管理机构、配备负责环境管理的人员、健全内部环境管理规章制度的要求。

二、环境管理组织架构框架

污水处理厂建立由总经理、运行经理、技术员、各班组负责人和化验室组成的环境管理责任体系，定期或不定期召开环保情况报告会议，专题研究解决环境问题，共同做好环境保护工作。有关职责如下：

1、环境管理总负责人（总经理）

- （1）全面负责污水处理厂的环境管理工作；
- （2）负责监督、指导管理架构内各成员的工作，审核环境报告和环境信息等；
- （3）负责组织制定并组织实施污染减排计划，落实削减目标；
- （4）负责组织制定并组织实施内部环境管理制度；
- （5）负责建立并组织实施污水厂环境突发事故应急制度。

2、运行经理、技术员

- （1）负责制定并监督实施环保工作计划和规章制度；
- （2）负责污染减排计划实施和工作技术支持，协助污染减排核查工作；
- （3）协助落实“三同时”验收准备工作；
- （4）负责检查产生污染的生产设施、污染防治设施及存在环境安全隐患设施的运转情况，监督各操作岗位的工作情况；
- （5）负责检查并掌握污染物的排放情况；

(6) 负责向环保部门报告污染物排放情况，污染防治设施运行情况，污染物削减工程进展情况以及主要污染物减排目标实现情况，报告进度按照环保部门要求进行。接受环保部门的指导和监督，并配合环保部门监督检查；

(7) 协助开展清洁生产、节能节水等工作；

(8) 组织编写环境应急预案，对突发性环境污染事件及时向环保部门汇报，并进行处理；

(9) 负责环境统计工作；

(10) 负责组织对污水厂员工的环保知识培训。

3、各班组负责人、化验室协助运行经理、技术员完成上述内容，同时做好份内工作。掌握原始记录，如实填写运行台账，化验记录，及时向总负责人报告异常情况；

4、环境管理员应承担的技术性事项

对于废水的管理与监督包括：

(1) 记录每日废水处理进水量，出水量，污水厂运行控制参数，设备运转时间及其他工艺运行参数。

(2) 不定期检查进水情况，协助巡查污水收集管网；

(3) 操作、检测并维护污水处理厂设施及其附属设备；

(4) 测定污水进出水质并记录其结果；

(5) 检测并维护现场仪器仪表；

(6) 当发生突发事件时，采取对环境影响较小的措施及其他必要应急措施。

对于固废的管理与监督包括：

(1) 调查污泥产生量及产生周期、频率；

(2) 检查剩余污泥的种类、性状并记录；

(3) 操作检测并维护处理污泥的设施及其附属设备；

(4) 设定并记录污泥委托处理，编制转移联单；

(5) 确认并现场检查污泥委托处理方的处理方法（包括收集运输、再生利用的中间处理和最终处置）；

(6) 突发污泥污染时采取的必要应急措施。

三、提高环境管理人员素质

对环境管理员具备知识的要求分为掌握、熟悉、了解三个层次。掌握即要求能在实际工作中灵活运用，熟悉即要求能够理解并简单应用，了解即要求具有环境管理相关的广泛知识。

1、环境管理总负责人要求具备知识：

- （1）了解国家环境保护方针政策及法律、法规；
- （2）了解环境保护基础知识；
- （3）了解一般环境污染防治及生态保护技术；
- （4）了解环境污染事故应急处理技术和相关知识。

2、环境管理员要求具备知识：

- （1）掌握国家环境保护方针政策及法律、法规；
- （2）掌握环境保护基础知识；
- （3）掌握污染防治理论和技术；
- （4）熟悉污染物测定和分析技术；
- （5）掌握环境污染事故应急处理技术和相关知识等；
- （6）掌握污水处理厂内各污染治理设施的基本情况。

五、健全环境管理台帐和资料

- 1、环境影响评价文件，包括环境影响报告书（表）、环境影响评价政府批文；
- 2、环境保护职责和管理制度；
- 3、污水处理厂设计、施工资料、竣工验收资料、设备采购资料；
- 4、环保“三同时”验收资料，污水处理厂竣工验收监测报告；
- 5、污染物排放总量控制指标；
- 6、废水和固废污染物处理设施日常运行状况和监测记录、报表，包括现状处理量、处理效率、运行时间、处理前和处理后排放情况、日常运行存在问题及解决措施落实情况；
- 7、废水排放管网和在线自动监测仪器日常维护保养记录；
- 8、分析监测仪器和设备日常维护和计量记录；
- 9、固废委外处理协议，固废安全转移处置联单；
- 10、主要噪声污染源数量、噪声级和厂界噪声监测数据；
- 11、环境风险事故措施和环境风险事故应急预案，事故应急演练组织实施方案、记录；

12、环境风险事故总结材料；

13、安全防护和消防设施日常维护保养记录；

14、环境管理员专业技术培训登记情况；

15、适用于本污水处理厂的环境保护法律、法规、规章制度及相关政策性文件；

16、当地环保部门要求保留备查的环境监控监测记录；

17、污水处理厂总平面布置图、污水管网线路图和雨水管网线路图，总平面布置图需标明污水进水口和排放口位置。

五、培训管理

为了统一工作，环境管理员的年度培训工作计划根据当地环保部门要求制定。培训考试合格者，可以获得培训合格证书。通过培训，使不同类别的环境管理人员掌握相应的专业知识和实际操作技术，确保其在工作岗位上履行职责的能力。培训内容包括：

1、环境保护基础知识、污染减排政策；

2、环境保护法律体系和标准体系；

3、社会责任和社会环境责任；

4、环境管理与监督基本理论及方法，包括日常环境管理和环境应急管理等；

5、环境污染控制技术和监测技术；

6、环境管理员制度框架。

附件8 工程竣工备案材料

监督登记号:
备 案 号 :431129202208220157-JX-002

工程竣工验收备案表

工程名称:	涛圩镇污水处理厂
建设单位:	江华马渡发展集团有限公司
法定代表人:	杨晴华



湖南省住房和城乡建设厅制
2022年12月20日

工程竣工验收备案表

建设单位名称	江华冯乘发展集团有限公司	联系人	李江松
		联系人电话	13789237880
建设单位地址	江华县沱江镇经开区 江华冯乘发展集团有限公司	建设单位信用代码	91431129753350195N
工程名称	涛圩镇污水处理厂		
工程地点	江华县大锡乡、蔚竹口乡、界牌乡、大石桥乡、沱江镇桥头铺片、桥市乡、河路口镇、涛圩镇、大路铺镇、小圩壮族乡、白芒营镇		
建筑面积(m²)或总 造价(万元)	建筑面积261.29(m²), 总造价1371.1600(万元)		
工程类型			
结构类型			
开工日期	2021-01-08		
竣工验收日期	2022-11-30		
施工许可证号	431129202209080102		
勘察单位名称	湖南核工业岩土工程 勘察设计院有限 公司	项目负责人	肖日亮
设计单位名称	华蓝设计(集团)有 限公司	项目负责人	曾金花
施工单位名称	湖南省天宇建设工程 有限公司	项目负责人	李祥顺
监理单位名称	湖南华兴建设管理有 限公司	项目负责人	周吉夏
工程质量监督机构 名称	江华瑶族自治县建设工程质量安全监督站		

本表一式五份,建设单位、施工单位、备案机关、城建档案部门、产权产籍管理部门各一份。

备案意见:

涛圩镇污水处理厂

工程

的竣工验收备案文件已于2022年12月19日收讫。

经核查, 备案归档文件: 齐全。

结论: 同意 (同意/不同意) 备案。

备案机关经办人(签字): 张江利

负责人(签章): 黄明林



备案机关处理意见:

同意备案。



(公章)

注:处理意见主要是指建设单位是否违反国家住建部第2号令《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的有关规定,如有违反行为,则按该实施细则第七条规定处罚。

附件9 工况表

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目
(涛圩镇)

验收期间生产工况

日 期	设计日废水处理量	实际日废水处理量	工况
2023. 3. 21	750m ³ /d	300m ³ /d	40%
2023. 3. 22	750m ³ /d	300m ³ /d	40%



附件10 验收意见

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)

竣工环境保护验收意见

2023年4月22日,江华冯乘发展集团有限公司组织召开了江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)竣工环境保护验收会,验收小组包括建设单位(江华冯乘发展集团有限公司)、验收报告编制及监测单位(长沙崇德检测科技有限公司)等单位代表,并特邀3名专家(名单附后)组成验收小组。根据《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(白芒营镇)竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收,形成竣工环境保护验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)位于湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩镇。项目主要新建处理规模江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)内容中750m³/d的污水处理厂及配套污水管网。

(二)建设过程及环保审批情况

企业于2020年9月委托北京国环益达环保技术有限公司编制了《江华瑶族自治县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目(涛圩镇)环境影响报告表》,并于2020年10月26日取得了永州市生态环境局的批复(江环评字[2020]17号)。

(三)投资情况

项目实际投资1371.16万,其中环保投资75万元。

(四)验收范围

本次验收范围是环评及批复界定的建设内容。

二、工程变动情况

无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

废水包括涛圩镇镇区范围内的居民生活污水、厂区生活污水，所有污水最后排入粗格栅池进入污水处理系统进行处理，厂区自身污水产生量较小，经污水处理系统处理达标后排放，尾水排入西河

（二）废气

项目污水处理厂恶臭气体、检查井井盖挥发出的少量恶臭气体及备用柴油发电机废气。污水处理厂一体化设施采取密闭，减少无组织排放，柴油发电机废气通过自然通风无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要是来源于提升泵、搅拌机等配套设备运行噪声。项目针对生产设备噪声采取加装消声器、封闭隔声、基础减震、建筑隔声等隔声、吸声和消声措施，以减少生产设备运行噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

项目本项目产生的固体废物主要是污水处理厂栅渣和污泥、废药剂包装袋及废紫外线灯管。

（1）格栅渣和污泥

项目污泥暂存于污泥储存池，通过专用垃圾车外运至送永州市南部生活垃圾焚烧发电厂处理处置进行处置。

（2）废药剂包装袋

本项目在运营过程使用 PAC、PAM 会产生一定量的废包装袋该部分废包装袋集中收集交由生产厂家回收处理。

（3）废紫外线灯管。

本项目在运营过程会产生一定量废紫外线灯管，废紫外线灯管属于危险废物，集中收集交由有资质单位处理。

四、环境保护监测结果

（一）废水

验收监测期间，验收监测期间，项目污水处理出口废水中的 pH 值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群、色度、铅、镉、铬，汞、六价铬、砷、烷基汞浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 一级 B 标准和表 2 标准值。

（二）废气

验收监测期间，该项目厂界无组织废气中硫化氢浓度最大值、氨浓度最大值、臭气浓度最大值、甲烷浓度百分比最大值符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及其修改单表 4 中二级标准限值要求。

（三）噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

五、验收结论

项目建设前期环境保护审批手续齐全，基本按照环评报告及批复要求落实了相关环保措施。通过现场核查及环境监测，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和自主验收的相关规定，验收组认为本项目满足竣工环境保护验收条件，可以通过竣工环境保护验收。

验收组成员（见签名表）

2023 年 4 月 22 日

江华瑶族自治县乡镇污水处理及配套管网建设项目(清江镇)

竣工环境保护验收签到表

地点:

2023 年 4 月 22 日

姓名	单位	职务/职称	联系电话
组长	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
成员	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
	李江松	江华瑶族自治县	13789237880
